




E

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat 1. část		PDPS
OBJEDNATEL: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava		
PROJEKTANT: SPOLEČNOST "SHP + SHB - Velké Meziříčí" HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Zbyněk Lazar		VEDOUcí SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI:  Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Bohunická 50 619 00 Brno

VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Martina Adamcová		PROJEKTANT OBJEKTU:	
VYPRACOVAL				SHP SK s.r.o. Mlýnské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava
KONTROLOVAL	Ing. Pavel Svoboda			
KRAJ:	VYSOČINA	DATUM	08/2025	
INVESTOR (OBJEDNATEL):	KRAJ VYSOČINA	FORMÁT		
NÁZEV OBJEKTU: E - DOKLADY			MĚŘÍTKO	
			ÚČEL	PDPS
			Č. ZAKÁZKY	20087DZS
			ARCHIVNÍ Č.	
NÁZEV VÝKRESU:		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU	

Zápis z pracovního jednání ze dne 8.4.2025, KrÚ Jihlava

Seznam účastníků: dle prezenční listiny.

Pracovní jednání bylo svoláno z důvodu zahájení projekčních prací na PDPS stavby.

Bylo projednáno:

- Termín odevzdání PDPS – 11.8.2025
- Bude uzavřen dodatek pro DUSP na termín (až společné povolení nabude právní moc)
- Předpoklad zadání veřejné zakázky – září/říjen 2025 – k tomuto termínu by měla být dokumentace připravena včetně dokladové části atd.

- Zapracovat podmínky z povolení stavby od MÚ Velké Meziříčí (ze všech)
- P. Čamek – dle telefonické domluvy s p. Čamkem mu projektanti pošlou údaje pro provedení sjezdu ve výškové úrovni projektovaného obchvatu – řádně popsat, o souřadnice jaké vrstvy se jedná. **Požadované podklady byly odeslány.**
- Do PDPS budou zapracovány odsouhlasené požadavky p. Čamka
- Pro PDPS bude zaměřeno skutečné provedení sjezdu, předpokládá se zachování vybudovaného sjezdu p. Čamkem, ale kompletní zhotovení silničního tělesa obchvatu bez využití navezených vrstev provizorní komunikace.

- Pozemky u odbočovacího pruhu SO 108 (část par. č. 6302 a část par. č. 6303) – OM vstoupí ještě jednou do jednání s majitelem pozemku Ing. Kamanem. Projektant zašle podklady pro jednání se zákresem opěrné zdi a dočasného záboru pro tuto zeď. **Požadované podklady byly odeslány.**
- Pokud nebude možné získat pozemek, bude doprojektována op. zeď na pozemku kraje, s využitím stávajícího příkopu pro dočasný zábor.
- Je třeba prověřit, zda bude třeba „Změna stavby před dokončením“, nebo bude op. zeď zahrnuta do projektu PDPS jako nepodstatná změna.
- Op. zeď bude součástí SO 108 (včetně rozpočtu)

- U paní Tomanové bude doplněna PDPS dle připojené smlouvy – nový vodovod, zachování studny apod.

- Firma KKB a pan Malec – budou zapracovány požadavky ze smluv a přílohy „SO 201 – most přes řeku Oslavu a silnici II/392, Průvodní zpráva projektové přípravy“
- Je zde mimo jiné uvedena i časová podmínka pro výstavbu mostu – zapracovat do harmonogramu výstavby

- V příloze jsou připojeny smlouvy, kterých jsou popsány výše uvedené požadavky:
KBB – nájemní smlouva
KBB (Malec) nájemní smlouva
Tomanová Michaela – Dohoda o vybudování vodovodní přípojky

- Bude prověřena bilance ornice - rozprostření na pozemky mimo pozemky stavby – dle informací od ing. Krepčíka nejsou některé pozemky k dispozici
- Budou prověřeny přístupy na staveniště nutné pro realizaci stavby (včetně pozemků) a budou zahrnuty do PDPS a rozpočtu
- Aktualizovat HMG a popsat uzlové body, které jsou nutné pro realizaci stavby či vyplývají z uzavřených smluv (např. pro most SO 201 v areálu KBB)

ROZPOČET

- Rozpočet všech částí sloučit do jednoho
- Dát položku na data pro DTM (porealizační zaměření)
- Všeobecné položky si probereme při tvorbě rozpočtu
- Bude prověřen rozsah kácení na pozemcích trvalého a dočasného záboru - prověří OM

PDPS

- Zvážit členění – probereme na dalším jednání.

Přeložky inž. sítí

- Zjistit stav, aktualizace smluv, příprava realizace
- ROVANET - uložení chrániček není požadováno.

Zapsal: Daniel Blaha

Stráský, Husťý a partneři s.r.o.
Bohunická 50, 619 00 Brno
tel.: +420 547 101 811, e-mail: shp@shp.eu,
www.shp.eu

PREZENČNÍ LISTINA

jednání k akci

"II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat", PDPS
konané dne 08.04.2025 v 13:00 hod.



	PŘÍJMENÍ, JMÉNO, TITUL (tiskacím písmem)	ORGANIZACE, FIRMA	PODPIS	TELEFONNÍ SPOJENÍ	E-MAIL	SOUHLAS *
1	BARTOS RAVEC	Kra Vysočina		724 650 438	BARTOS.T@KRA-VYSOCHINA.CZ	ANO - NE
2	KREPELÍK Petr	KRA VYSOCHINA		424 650 199	KREPELIK.P@KRA-VYSOCHINA.CZ	ANO - NE
3	SEHOŘADOVÁ HEDVÍKA	KRA VYSOCHINA		564 602 248	SEHOŘADOVA.H@KRA-VYSOCHINA.CZ	ANO - NE
4	HARTMANOVÁ PAVLA WETZ	KRA VYSOCHINA		724 650 221	hartmanova.p@kro-vysocina.cz	ANO - NE
5	JANÍČEK Blanka	Kra Vysočina		724 650 104	bl.k.janicek@vysocina.cz	ANO - NE
6	Kouřilová Martina	SHPSK		433 735 517	m.kouřilova@shp.eu	ANO - NE
7	CHPÁK Zbyněk	SHPSK		605 362 679	z.chpak@shp.eu	ANO - NE
8						ANO - NE
9						ANO - NE
10						ANO - NE
11						ANO - NE
12						ANO - NE
13						ANO - NE
14						ANO - NE
15						ANO - NE
16						ANO - NE
17						ANO - NE
18						ANO - NE
19						ANO - NE
20						ANO - NE

* SOUHLAS (nehodí se škrtněte)
ANO - účastník jednání souhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání
NE - účastník jednání nesouhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

Zápis z pracovního jednání ze dne 02.06.2025, KrÚ Jihlava

Seznam účastníků: dle prezenční listiny.

Průběžné jednání bylo svoláno z důvodu sdělení postupu prací na PDPS stavby.

Projednávané body:

Materiály a konstrukce pro stavbu:

- Konstrukce vozovek navržené v DSP budou v projektu ponechány beze změn. Budou opraveny pouze drobné nesrovnalosti – např. modifikované postřiky pod nemodifikovaným ACO kobercem.
- Svodidla – bude podrobně popsána úroveň zadržení jednotlivých typů
- Povrchová úprava krajnic – bude z recyklovaného materiálu frakce 0/22. Materiál se získá po odfrézování asfaltových vrstev vozovky rušeného úseku II/360, mat. se uloží na mezideponii a po předrcení se použije na krajnicích.
- Zbylý vyfrézovaný materiál bude uložen na mezideponii a po dohodě s KSÚSV uložen na skládku v areálu KSÚSV Velká Bíteš (15 km)
- Vodorovné dopravné značení – u částí objektů, které půjdou do předčasného užívání (křižovatka se stávající II/360 SO 102) nejprve předznačení barvou, následně plast. Jinak bude použit pouze plast.
- Ochranná protihluková stěna – materiál panelů bude hliník.
- Uložení vyzískané ornice – pozemek určený v rozhodnutí k trvalému odnětí zemědělské půdy na zúrodnění půdy bude zastavěný. Je nutné pro rozproštění ornice určit novou plochu (Zemědělské družstvo Oslavice) a ověřit, zda je potřeba aktualizace rozhodnutí. Prověří projektant.
- Zábradlí na mostě 201 – bylo řešeno, jaké provedení použít nad KBB. Zda polykarbonát či tahokov. Přítomní se neshodli na jednotném názoru. Projektant do příště nachystá vhodný návrh dle zkušeností z jiných staveb v kraji či jinde. Barva zábradlí májová zeleň případně šedá. Barevnost zábradlí na stavbě ještě bude řešit město VM. Zástupce města dodá projektantovi jejich návrh.
- Opěrnou zeď SO 212 navrhuje projektant realizovat s plynulým lícem (v DSP stěna lomená podle dilatačních celků). Nejsou ovlivněny zábory ani související objekty stavby. Přítomní neměli proti změně námitek.
- Zábradlí na zárubní zdi SO 213 bude lankové s plynulým průběhem.

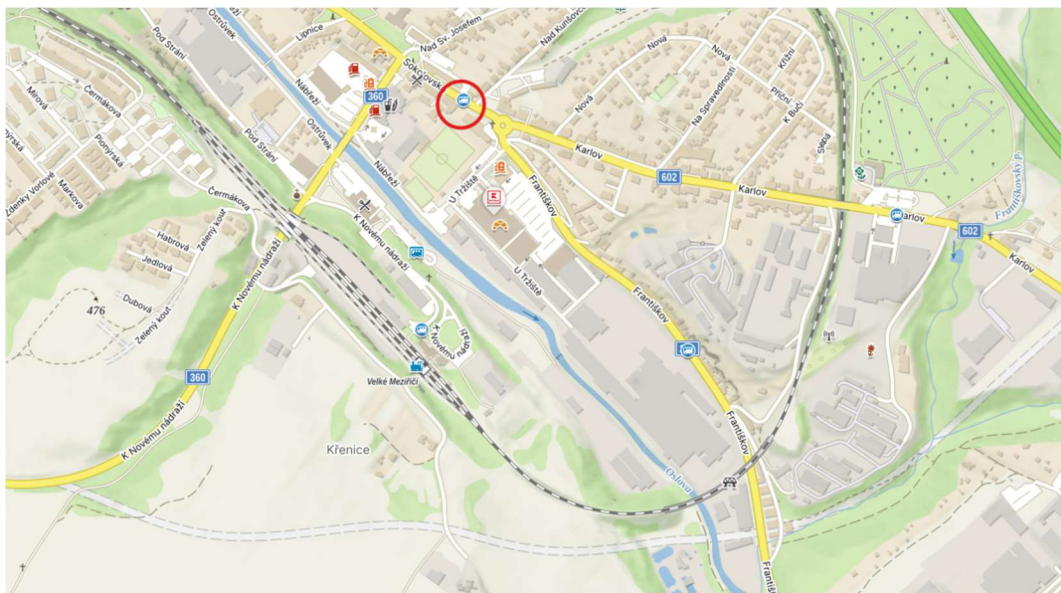
Organizace výstavby:

- Doprava výkopového materiálu do násypů – bude probíhat primárně po tělese stavby v trvalém záboru. Přesun zeminy do části násypů v úseku obchvatu za řekou (cca 20.000 m³) bude po krajských komunikacích II/360 a II/602, u kterých je do budoucna uvažováno s rekonstrukcí.
- Pohyb stavební techniky u tubosideru – technika bude objíždět tubosider po straně násypu. Bude nutné provizorní zatrubnění potoka – do rozpočtu bude zahrnuta položka pro toto zatrubnění (SO 203)
- Most SO 202 – je nutné zajistit možnost využití pozemků č. 6324/2 a 6325/1 pro dočasné využití staveništní dopravou – prověřit p. Semotamová, KrÚ Vysočina
- Most u ČOV přes řeku Oslavu uvažovaný pro přepravu techniky a materiálů pro stavbu mostu SO 201 – most je dle zprávy z hlavní mostní prohlídky ve stavu IV: uspokojivý, diagnostika mostu ale nebyla provedena. Zatížitelnost mostu je neznámá. Je zde riziko, že zhotovitel nebude chtít daný most využít a mohl by nárokovat změnu termínu.

- Proto je nutné, aby Město VM zajistilo do začátku stavby podrobnou diagnostiku mostu a přepočet zatížitelnosti.
- P. Šilhavý, Město Velké Meziříčí, zjistí, zda jsou k dispozici zprávy z další mostní prohlídky a dokumentace k mostu. Projektant zajistí pro potřeby investora v rámci projektu PDPS odborné posouzení zatížitelnosti mostu na základě dostupných informací.

Ostatní:

- Úprava příjezdových tras – nebude se jednat o celoplošnou opravu, ale jenom o dílčí opravy vozovek. Před výstavbou obchvatu se provede pasportizace komunikací. Projektant stanoví procentuálně odhad lokálních oprav. Stavební objekt bude rozdělen na dvě části: úprava krajských komunikací II/360 a II/602 (lokální opravy) a úprava MK k betonárce (lokální opravy + oprava okrajů).
- P. Blaha pošle vzor všeobecných položek do rozpočtu
- Projektant pošle situaci navrženého sjezdu k pozemku č. 5220/1. Tento sjezd bude začleněn do SO 101.
- Na CDE budou nahrány platné dokumentace DÚR, DUSP, DSP a IČ.
- Sjezd p. Čamek bude hotový 20.6.2025. Poté provede projektant zaměření pro ověření souladu s projektem.
- Termín odevzdání konceptu PDPS je 31.7.2025. Bude uzavřen termínový i finanční dodatek k DUSP, kvůli doplnění opěrné zdi u SO 108.
- Bc. Semotanová dodá projektantovi informaci, jak bude naloženo s dřevní hmotou po kácení solitérních stromů i lesního porostu.
- **Bc. Šilhavý informoval, že bylo zrušeno výběrové řízení na zrušení mostu ev.č. 602-027 na ulici Sokolovská (silnice II/602). Tato stavba měla proběhnout letos, ale zrušením tendru se posouvá do příštího roku, kdy se dostane do kolize s objízdou trasou pro stavbu obchvatu. Nutno tedy koordinovat realizaci přestavby tohoto mostu se stavbou obchvatu.**



Záznam zapsala: Ing. M. Adamcová / Ing. Z. Lazar

V Brně 3.6.2025

Příloha:

- 1) Prezenční listina

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Bohunická 50, 619 00 Brno
tel.: +420 547 101 811, e-mail: shp@shp.eu,
www.shp.eu












PREZENČNÍ LISTINA

jednání k akci

" II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat "

konané dne 2.6.2025 v 09:30 hod.

	PŘÍJMENÍ, JMÉNO, TITUL (tiskacím písmem)	ORGANIZACE, FIRMA	PODPIS	TELEFONNÍ SPOJENÍ	E-MAIL	SOUHLAS *
1	SEMOTAMOVÁ MICHAELA, Bc	KRAJ VYSOČINA		524 601 248	semotamova.m@kr-vysocina.cz	ANO - NE
2	HARTMANOVÁ PAULŮ ILETA	KRAJ VYSOČINA		724 610 229	hartmanova.p@kr-vysocina.cz	ANO - NE
3	SLIWKA PAVEL, Ing.	SHR Brno		734 705 985	p.slivka@shp.eu	ANO - NE
4	VILHAVÝ ANTONÍK	MĚSTO VY		777 594 132	SILHAVY@VELKEMEZIRICI.CZ	ANO - NE
5	PAVEC BARTOŠ	Kraj Vysočina		726 050 138	BARTOS.P@Kra-vysocina.cz	ANO - NE
6	MARTINEK KOVČILOVÁ	SHR		733 735 557	m.kovni1ov2@shp.eu	ANO - NE
7	Daniel Dlabal	KRAJ VYSOČINA		724 650 184	blal.d@kr-vysocina.cz	ANO - NE
8	MILOS ETETPÁNEK	KRAJ VYSOČINA		223 882 521	ETETPANEK.M@Kra-vysocina.cz	ANO - NE
9	LAZAR ZBROVŮR	SHR Brno		605 367 679	7.lazar@shp.eu	ANO - NE
10						ANO - NE
11						ANO - NE
12						ANO - NE
13						ANO - NE
14						ANO - NE
15						ANO - NE
16						ANO - NE
17						ANO - NE
18						ANO - NE
19						ANO - NE
20						ANO - NE

* SOUHLAS (nehodí se škrtněte)

ANO - účastník jednání souhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

NE - účastník jednání nesouhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání
