




VÝKRES DEMOLIČNÍCH PRACÍ
PODÉLNÝ ŘEZ - I. FÁZE
M 1:100

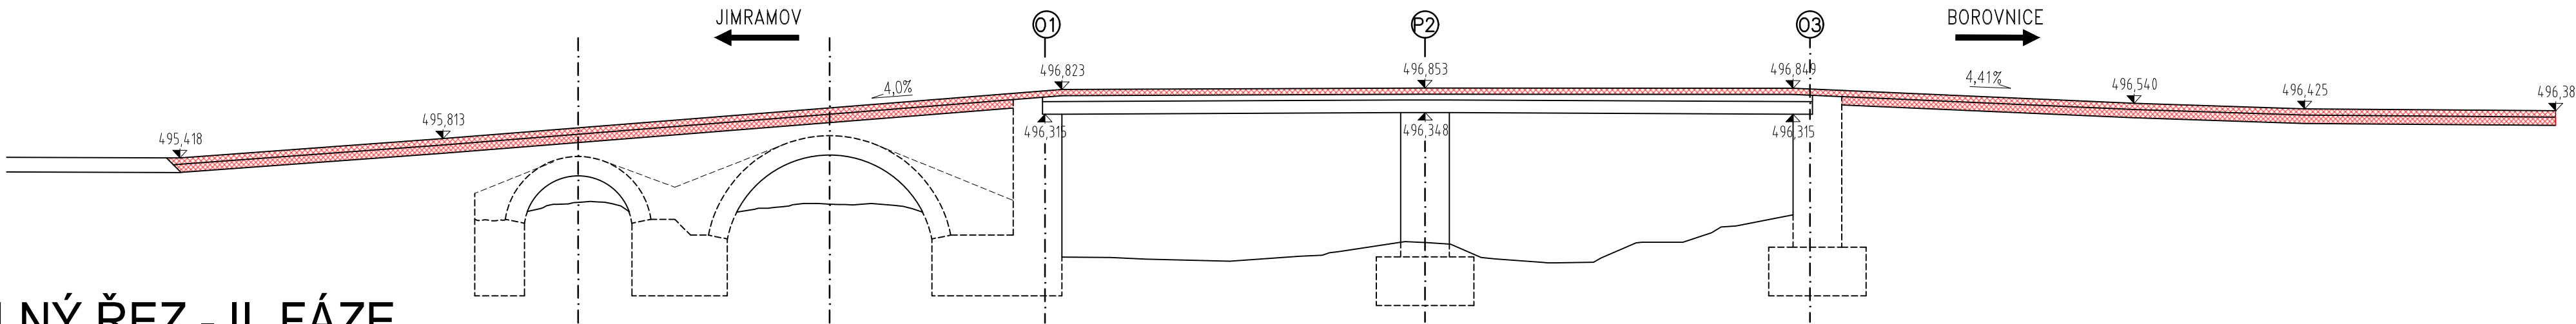


PODÉLNÝ ŘEZ - II. FÁZE
M 1:100

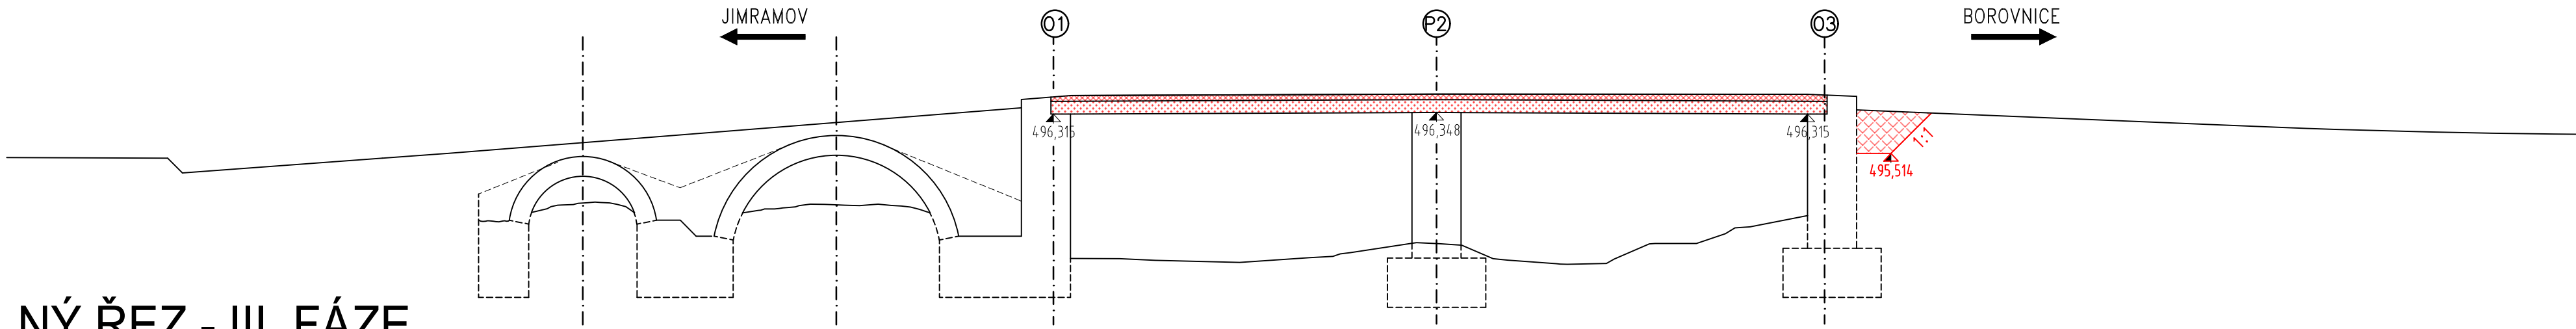


PODÉLNÝ ŘEZ - III. FÁZE
M 1:100

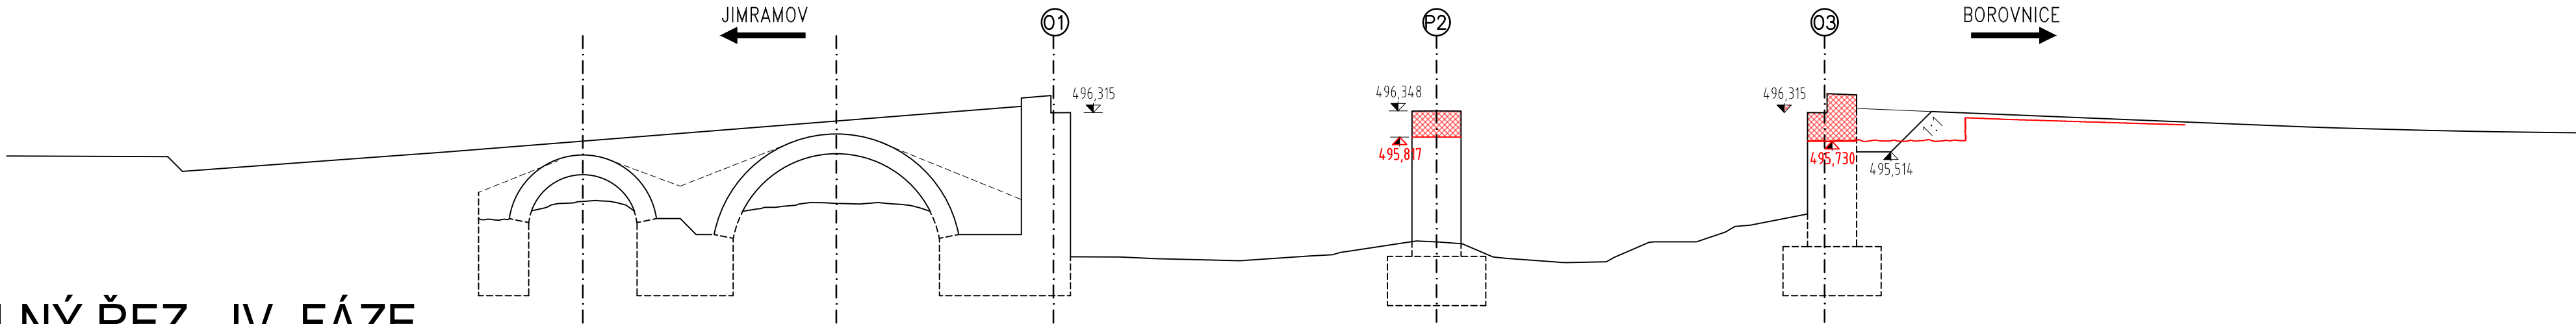


PODÉLNÝ ŘEZ - IV. FÁZE
M 1:100

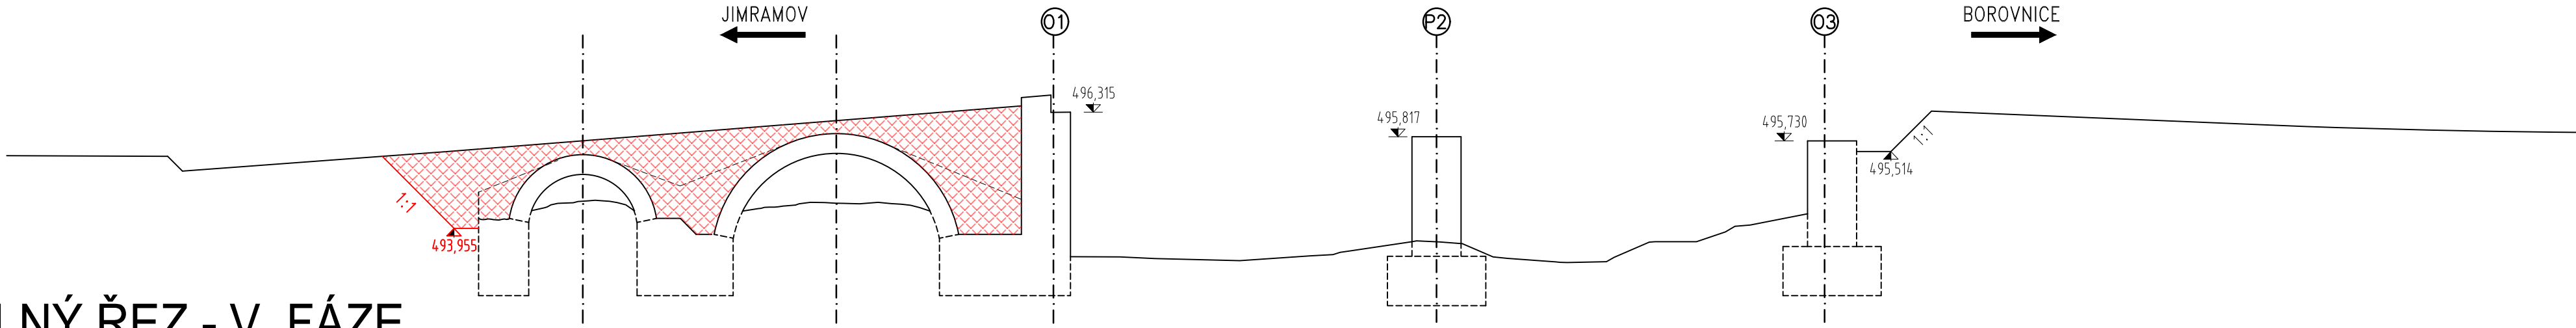

PODÉLNÝ ŘEZ - V. FÁZE
M 1:100

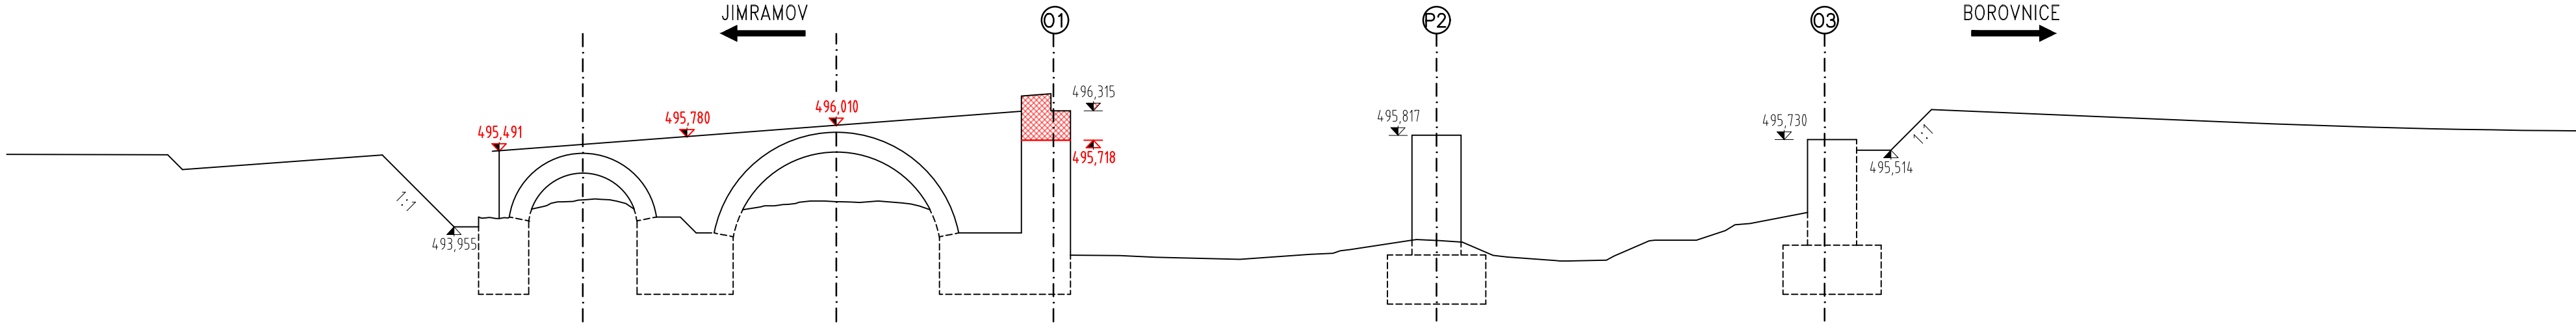

POHLED Z POVODNÍ STRANY
ÚROVEŇ BOURÁNÍ PRŮČELNÍCH ZDÍ
M 1:100

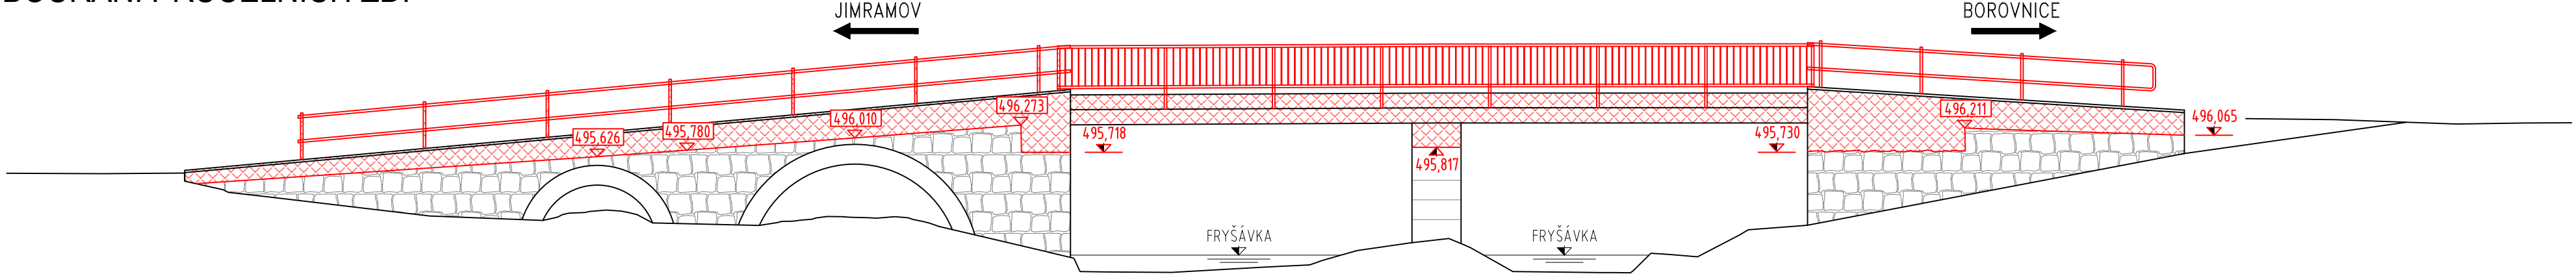

POPIS FÁZÍ DEMOLICE

- FÁZE I:
- DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ, STÁVAJÍCÍHO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 - FRÉZOVÁNÍ OBRUSNÉ VRSTVY SILNIČNÍ FRÉZOU V CELÉ DÉLCE REKONSTRUOVANÉHO ÚSEKU DLE SO 101
 - ODSTRANĚNÍ VOZOVKOVÝCH SOUVRSTVÍ V CELÉ DÉLCE REKONSTRUOVANÉHO ÚSEKU DLE SO 101
 - POUŽITÁ MECHANIZACE NEBUDE PŘEVÝŠOVAT V SOUČTOVÉ HMOTNOSTI VÝHRADNÍ ZATÍŽITELNOST MOSTU - 16 t

- FÁZE II:
- DEMOLICE ŽELEZOBETOVÝCH ČÁSTÍ MOTOVKY (ŘÍMSY, DESKA)
 - DEMONTÁŽ OCELOVÝCH ČÁSTÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
 - VYTVOŘENÍ VÝKOPU ZA OPĚROU 3

- FÁZE III:
- DEMOLICE KAMENNÝCH ČÁSTÍ OPĚRY 3 A PODPĚRY 2 DO PŘEDEPSANÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ
 - DEMOLICE ROVNOBĚŽNÝCH KAMENNÝCH KŘIDEL (VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ VIZ POHLED Z POVODNÍ STRANY)



- FÁZE IV:
- ROVNOMĚRNÉ ODTĚŽENÍ ZÁSPY KLENB Z PROSTORU MIMO MOST
 - VYTVOŘENÍ VÝKOPU V PŘEDMOSTÍ

- FÁZE V:
- DEMOLICE KAMENNÉ ČÁSTI OPĚRY 1 DO PŘEDEPSANÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ
 - DEMOLICE KAMENNÝCH POPRSNÍCH ZDÍ KLENB DO PŘEDEPSANÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ

- POZNÁMKY
- PO DOBU DEMOLICE BUDE ZAMEZEN PŘÍSTUP OSOB DO OKOLÍ MOSTU A POD BOURANÉ KONSTRUKCE
 - PO DOBU BOURACÍCH PRACÍ BUDE ZAMEZEN VJEZD TÍŽKÉ TECHNIKY NA OBNAŽOVANÉ KONSTRUKCE KLENB
 - BUDE ZAMEZENO PÁDU SUTI DO VODNÍHO TOKU A JEHO ZNEČIŠTĚNÍ, OMEZENÍ PRŮTOČNOSTI
 - S ODPADY BUDE ZACHÁZEÑO DLE 185/2001Sb. V PLATNEM ZNĚNÍ

SO 201

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

	RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČO: 25 32 56 80, Tel./Fax: 543 236 081, e-mail: rybak@rybak.cz ČSN EN ISO 9001, z. certifikátu 018-018-2004	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. Vít Rybák	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Vít Rybák	
	VYPRACOVAL : Bc. Lukáš Jedlička	
KONTROLOVAL : Ing. Jiří Bednárík		
KRAJ : Vysočina	MĚSTSKÝ ÚŘAD : Jímramov	DATUM : 08/2018
INVESTOR : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava		ZAKÁZK.Č. :
OBJEDNATEL : ALPINE Bau CZ, Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí		FORMÁT : BxA4
AKCE : II/357 JIMRAMOV – MOST EV.Č. 357–020		MĚŘÍTKO : 1:100/50
	SO 201 MOST PŘES FRYŠÁVKU	SOUBOR : SOUPRAVA
		STUPEŇ : RDS
PŘÍLOHA : VÝKRES DEMOLIČNÍCH PRACÍ		Č. PŘÍLOHY :
