


- S1 UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉHO ZÁKLADU PŮVODNÍCH STROJŮ DO HLoubKY -0,150
- S2 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLECHOVÉHO KRYTU STÁVAJÍCÍHO INSTALAČNÍHO KANÁLU VČETNÉ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH ÚHELNIKŮ 45x45mm OBVODOVÉ STĚNY tl.125 a 150mm VYBOURAT VČETNÉ KOTEV ÚHELNIKŮ A VYZTUŽÍ STÁVAJÍCÍ BETON MEZI ZDI A INSTALAČNÍM KANÁLEM UBOURAT CCA 30-40mm - NOVÁ SAM.STĚRKA
- S3 ZAŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍ LITÉ PODLAHY DO ROVINY PRO NÁPOJENÍ ŘEŠENÉ ČÁSTI
- S4 VYBOURÁNÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ PODLAHY Z DŘEVĚNÝCH KOSTEK VÝŠKY 100mm S ASF.ZÁLIVKOU VČETNÉ ODSTRANĚNÍ PÍSKOVÉ LOŽNÉ PLOCHY tl.50 mm
- S5 VYBOURÁNÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PODLAHY DODATEČNĚ PROVEDENÁ tl.40 mm NA PŮVODNÍ PODLAZE Z KOSTEK

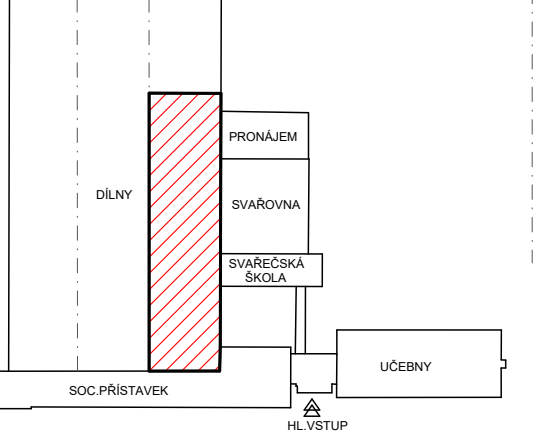

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Filip Marek projektová činnost ve výstavbě Brněnská 326/34, Žďar nad Sázavou IČO 72464372 mobil.777 126 995	
Filip Marek	Filip Marek	HP 450 C	Filip Marek		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava			e-mail:marek@stavprojekt.cz	www.stavprojekt.cz
MÍSTO STAVBY	Strojírenská 6, 591 01 Žďar nad Sázavou			FORMÁT	8 A4
SPŠ Žďar nad Sázavou - Strojírenská STAVEBNÍ ÚPRAVY PODLAHY ČÁSTI HALY - LOŽ 3				DATUM	6/2025
				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY				Č.ZAKÁZKY	9/2025
PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
					03
