

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/388 Zvole, most ev. č. 388-009“

Číslo smlouvy objednatele: 97/2019/D2/ZPŘ/ZR/M

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-STM07

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Ing. Jan Matoušek, referent investiční výstavby
Technický dozor: Ing. Albert Jurkovič, IMDS s.r.o.
Koordinátor BOZP: Ing. Marta Smerekovská, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina

10-10-2019
č.j.: 015685/2019. UJ

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Starmosty s.r.o.
se sídlem: Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6 Dejvice
zastoupený: Ing. Michalem Tichovským, na základě plné moci
zapsán u Městského soudu v Praze – C 295004
Kontaktní osoba: Ing. Michal Tichovský
Doručovací adresa: Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha - Modřany
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Michal Tichovský
technických: Michal Kabela
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: 283983368/0300
IČO: 07122764
DIČ: CZ07122764
Telefon: 225 153 042

Fax: ---
E-mail: office@starmosty.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 15. 7. 2019 spočívající v prodloužení termínu uvedení celé stavby do předčasného užívání z důvodů uvedených v Žádosti zhotovitele ve věci posunutí termínu, která je spolu fotodokumentací nedílnou přílohou tohoto dodatku.

2.2. V Článku IV. stávající smlouvy se tímto prodlužuje termín v odst. 4.1., a to v písm. b), konkrétně takto:

Původní znění v Článku IV. Doba plnění, odst. 4.1., písm. b):

b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 4 měsíců** od předání a převzetí staveniště

Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2019, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 31. 10. 2019.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 8. 11. 2019**

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 97/2019/D2/ZPŘ/ZR/M jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 97/2019/D2/ZPŘ/ZR/M uzavřené dne **15. 7. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Žádost zhotovitele ve věci posunutí termínu dokončení z 2. 10. 2019 a Fotodokumentace.

Přílohy: Žádost zhotovitele ve věci posunutí termínu dokončení z 2. 10. 2019
Fotodokumentace


Zhotovitel:

Objednatel:

V Jihlavě dne: 15. 10. 2019

V Praze dne: 09. 10. 2019


.....
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace


.....
Ing. Michal Tichovský
na základě plné moci

Krajská správa a údržba
032 silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Starmosty s.r.o.
Na čihadle 958/57
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 071 22 764 DIČ: CZ07122764
-2-

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupená Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
k rukám pana Jana Matouška, referenta investiční výstavby
k rukám Ing. Moniky Vavříkové, pověřené investiční náměstkyni

V Praze dne 2.10.2019

Věc: Smlouva o dílo ke stavbě „II/388 Zvole, most ev.č. 388-009“, č. SOD
objednatele: 97/2019/D2/ZPŘ/ZR/M ze dne 15.7.2019 uzavřená mezi
smluvními stranami

Objednatel :

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČ: 00090450

DIČ: CZ00090450

a

Zhotovitel:

Starmosty s.r.o.

se sídlem Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6 Dejvice

IČ: 07122764

DIČ: CZ07122764

Věc: Žádost zhotovitele ve věci posunutí termínu dokončení

Vážení,

tímto se na Vás obracíme ve věci výše označené smlouvy o dílo ke stavbě „**II/388 Zvole, most ev.č. 388-009**“ a v návaznosti na přílohu SoD. č.3 - Obchodní podmínky zadavatele, Článek III. Doba plnění, odst. 3.9., si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení termínu o TŘI dny v souvislosti s nevhodnými klimatickými podmínkami ve dnech 9.9.-11.9.2019, kdy byl zaznamenán první povodňový stupeň dle schváleného protipovodňového plánu na vodoteči OLEŠNÁ.

Dále Vás žádáme o prodloužení termínu o dalších 5 dní v souvislosti s požadovanými změnami, které byly zjištěny v průběhu provádění stavby. Při zpracování RDS bylo při řešení silniční části zjištěno, že v KÚ (km 0,098 00) je pravá část stávající silnice prakticky v nulovém příčném sklonu (výška na ose 488,44, výška stávající pravé hrany 488,44). Dle podélného profilu komunikace je v km 0,098 00 podélný spád 0,07% (prakticky 0%). To znamená, že v KÚ jsou na pravé straně silnice vytvořeny předpoklady pro vznik kaluže vody. Bez změny délky úpravy komunikace nelze tento detail opravit. Toto opatření si vyžádá nejenom delší dobu výstavby, ale rovněž změnu týkající se ceny díla. Cenová změna však není součástí této žádosti.

Termín pro uvedení stavby do provozu byl podpisem smlouvy, článek IV, odst. 4.1 písmeno b, stanoven na 31.10. 2019. Dle výše uvedených důvodů bude nový termín posunut na 8.11.2019

V úctě

Starmosty s.r.o.
Na číhaře 958/57
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 071 22 764 DIČ: CZ07122764


Ing. Michal Tichovský, jednatel společnosti Starmosty s.r.o.

na základě plné moci

Přílohy: Zápis ve SD č. listu 3140013 a 3140014

Fotografie odečet výšky hladiny

Fotografie zaplavení stavby

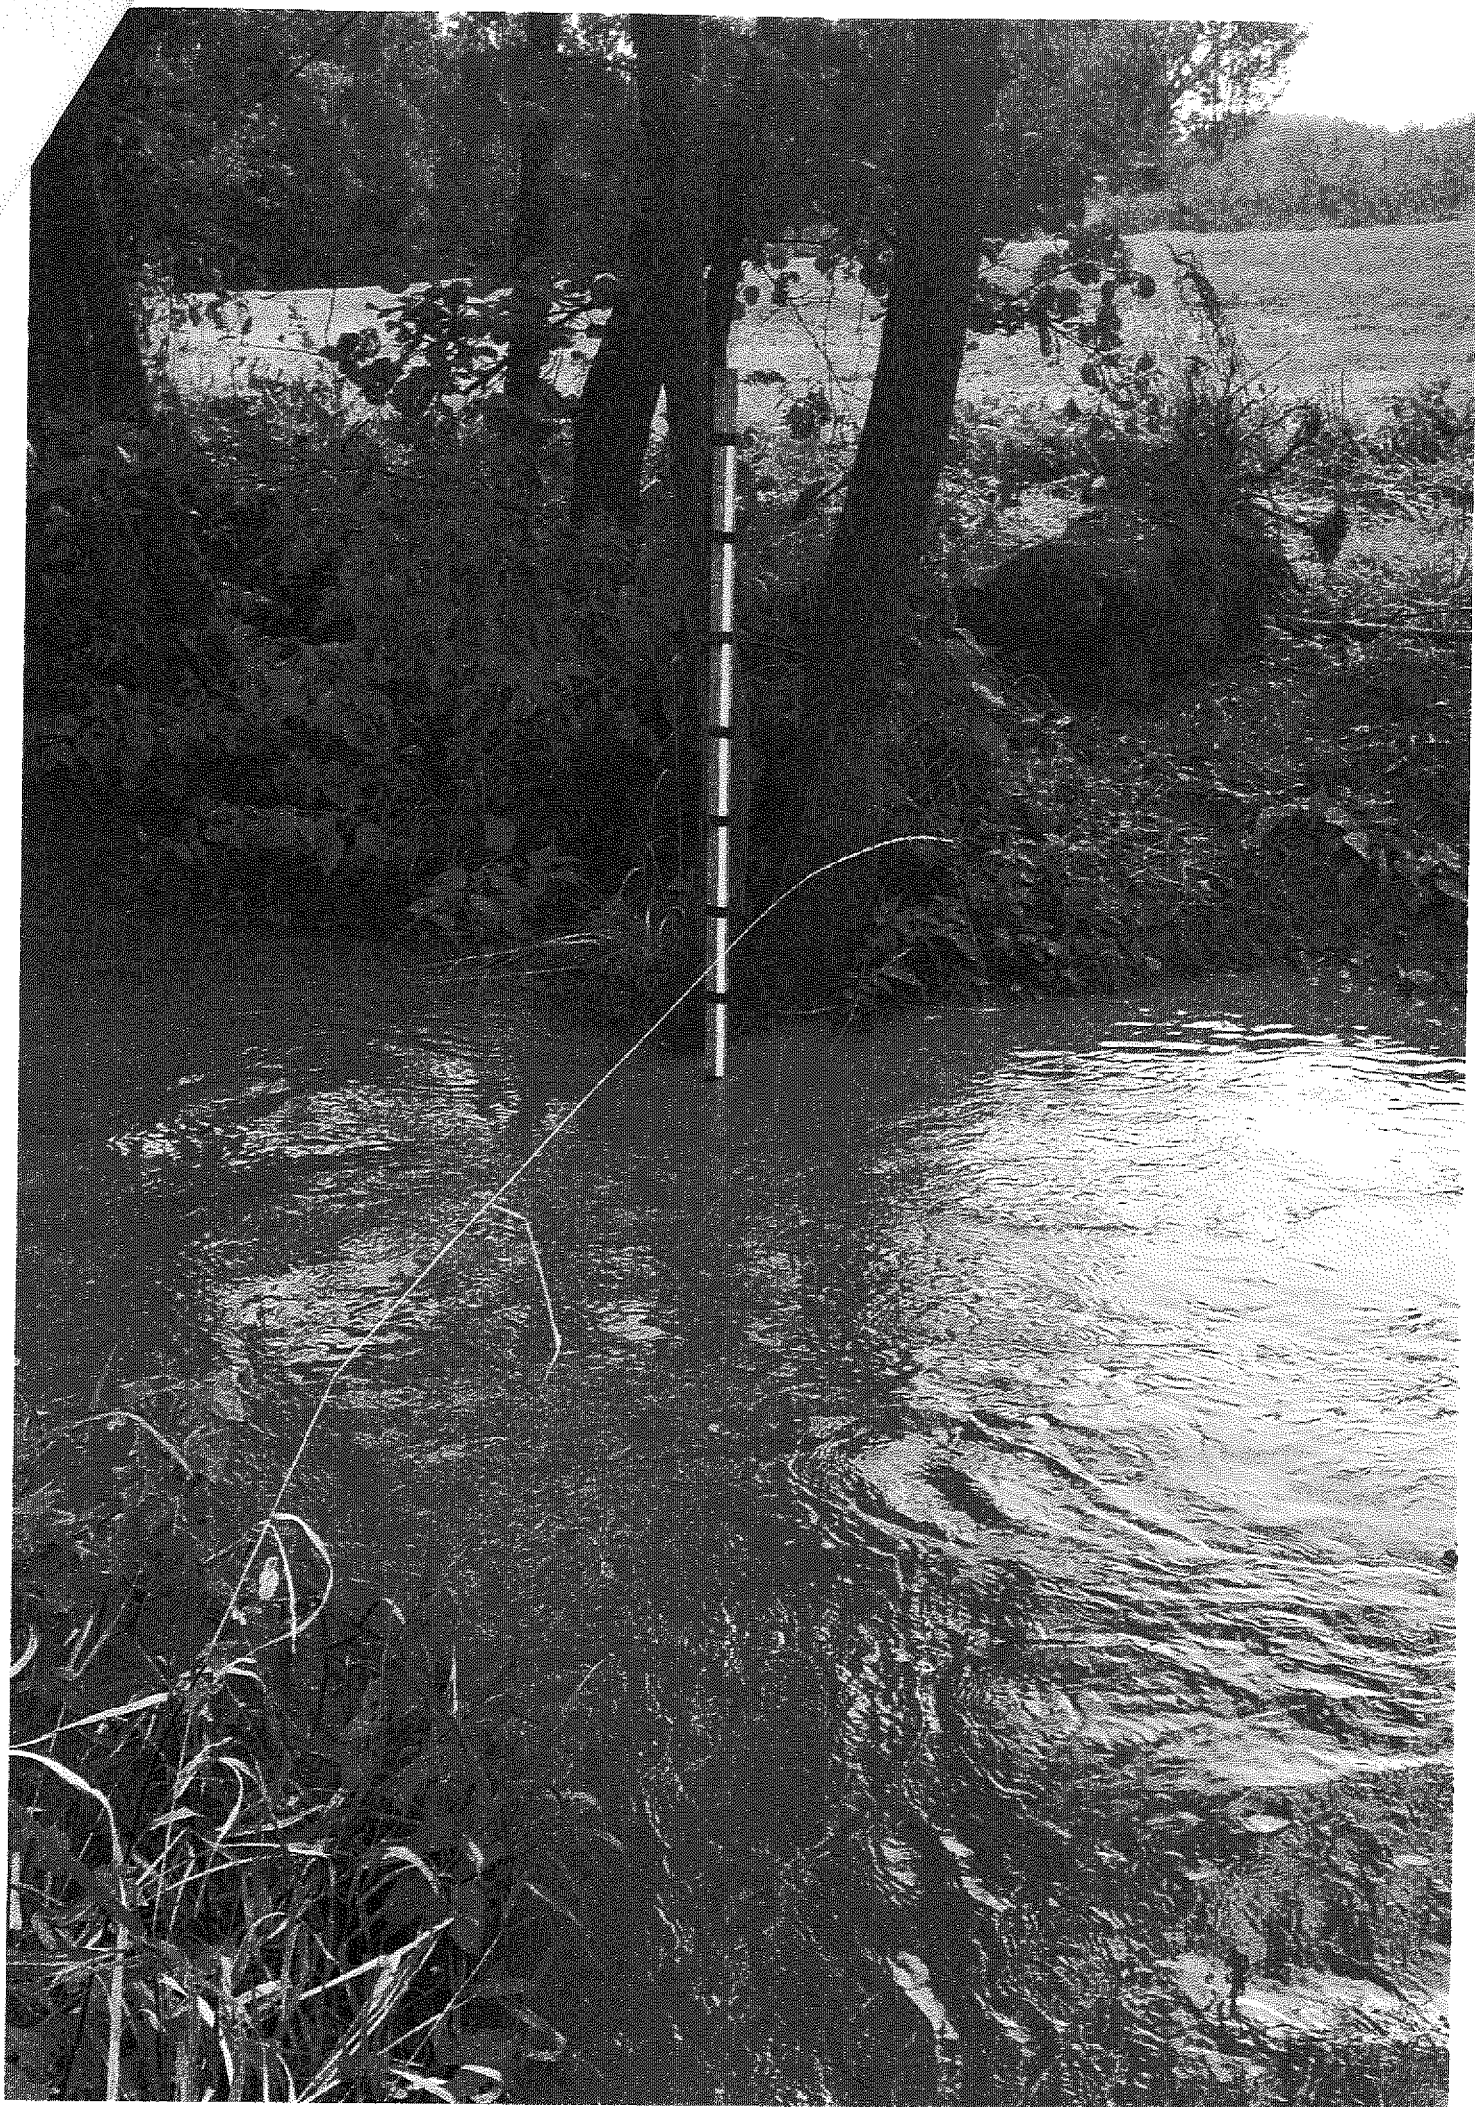

2019/9/1

DELIŠE: TRUSKY, BOČKA, KI BALICA,
POSTUPKA, BOČKY BOČKY, BOČKA
MECHANIZACE: CENTRÁLA, KI NAKON, KIOW NAKON,
KI OBRADLO

POPIS PRÁCE:

- OBRADLO VÝJ 10 STAV. ŽIV. 24 HOD.
- OBRADLO ARMATURY A ZAKLON
- OBRADLO PŘEDLOŽENÍ OD GLAT
- VÝHOTOVENÍ NOVOU HRÁZE PŘED VÝHOTOVENÍ DO TRUSKY

12.9.19 ZÁPIS VÝHOTOVITEL:

STAVTEK - PRÁCE V DNE 12.9.19 V PRÁCE
NA OP 1. KTERÝ BYL PO ZAPLOVÁNÍ VÝHOTOVENÍ

12.9.19 PRÁCE: 9°C - 11°C PŘELOŽENÍ

STAVTEK PRÁCE V DNE 12.9.19 V PRÁCE

PRÁCE V DNE 12.9.19 V PRÁCE

DI. TRUSKY BOČKY NAKON, KIOW NAKON,
BOČKY BALICA

MECHANIZACE: CENTRÁLA, KI OBRADLO, KI NAKON,
KIOW NAKON,

POPIS PRÁCE:

- PRÁCE V DNE 12.9.19 V PRÁCE
- OBRADLO VÝJ 10 STAV. ŽIV.
- OBRADLO PŘEDLOŽENÍ PŘEDLOŽENÍ OP 2.
- OBRADLO PŘEDLOŽENÍ PŘEDLOŽENÍ OP 2.

SHOT ON REDMI NOTE 5
DUAL CAMERA

2019/9/11

CENTRÁLNY EKOLOGICKÝ POKUSNÝ
NA ČERPADLO

POPIS PRÁCE:

- PRÁCE NA STAVE
- OČISTENIE VODY ZO STAV. JAM

PRÁCE ZHOTOVITELE:

- DNEŠNÉHO DNE BYLY PRÁCE PRÁCE NA STAVE S DÍVOM SILNÝHO PRÁCE A LOPLOVÝM STAVY.
- HLODINA VODY V POTOKU BYLA VYŠŠIA O 50 CM OTO DNE KORYTO

11.9.19 POČASÍ: 8°C - 15°C POUČASÍ
 ÚČETNÍ PRÁCE NA STAVE S DÍVOM SILNÝHO PRÁCE
 PRÁCE NA STAVE S DÍVOM SILNÝHO PRÁCE

D: PRÁCE NA STAVE S DÍVOM SILNÝHO PRÁCE
 PRÁCE NA STAVE S DÍVOM SILNÝHO PRÁCE
 PRÁCE NA STAVE S DÍVOM SILNÝHO PRÁCE

POPIS PRÁCE:


- ČERPADLO VODY ZO STAV. JAM
- OČISTENIE VODY ZO STAV. JAM
- OČISTENIE STAVY.

11.9.19 PRÁCE NA STAVE S DÍVOM SILNÝHO PRÁCE
 ÚČETNÍ PRÁCE NA STAVE S DÍVOM SILNÝHO PRÁCE

11.9.19 PRÁCE NA STAVE S DÍVOM SILNÝHO PRÁCE
 ÚČETNÍ PRÁCE NA STAVE S DÍVOM SILNÝHO PRÁCE

11.9.19 POČASÍ: 11°C - 11°C POUČASÍ
 ÚČETNÍ PRÁCE NA STAVE S DÍVOM SILNÝHO PRÁCE
 PRÁCE NA STAVE S DÍVOM SILNÝHO PRÁCE

NOT ON REDMINOTE 5
DUAL CAMERA

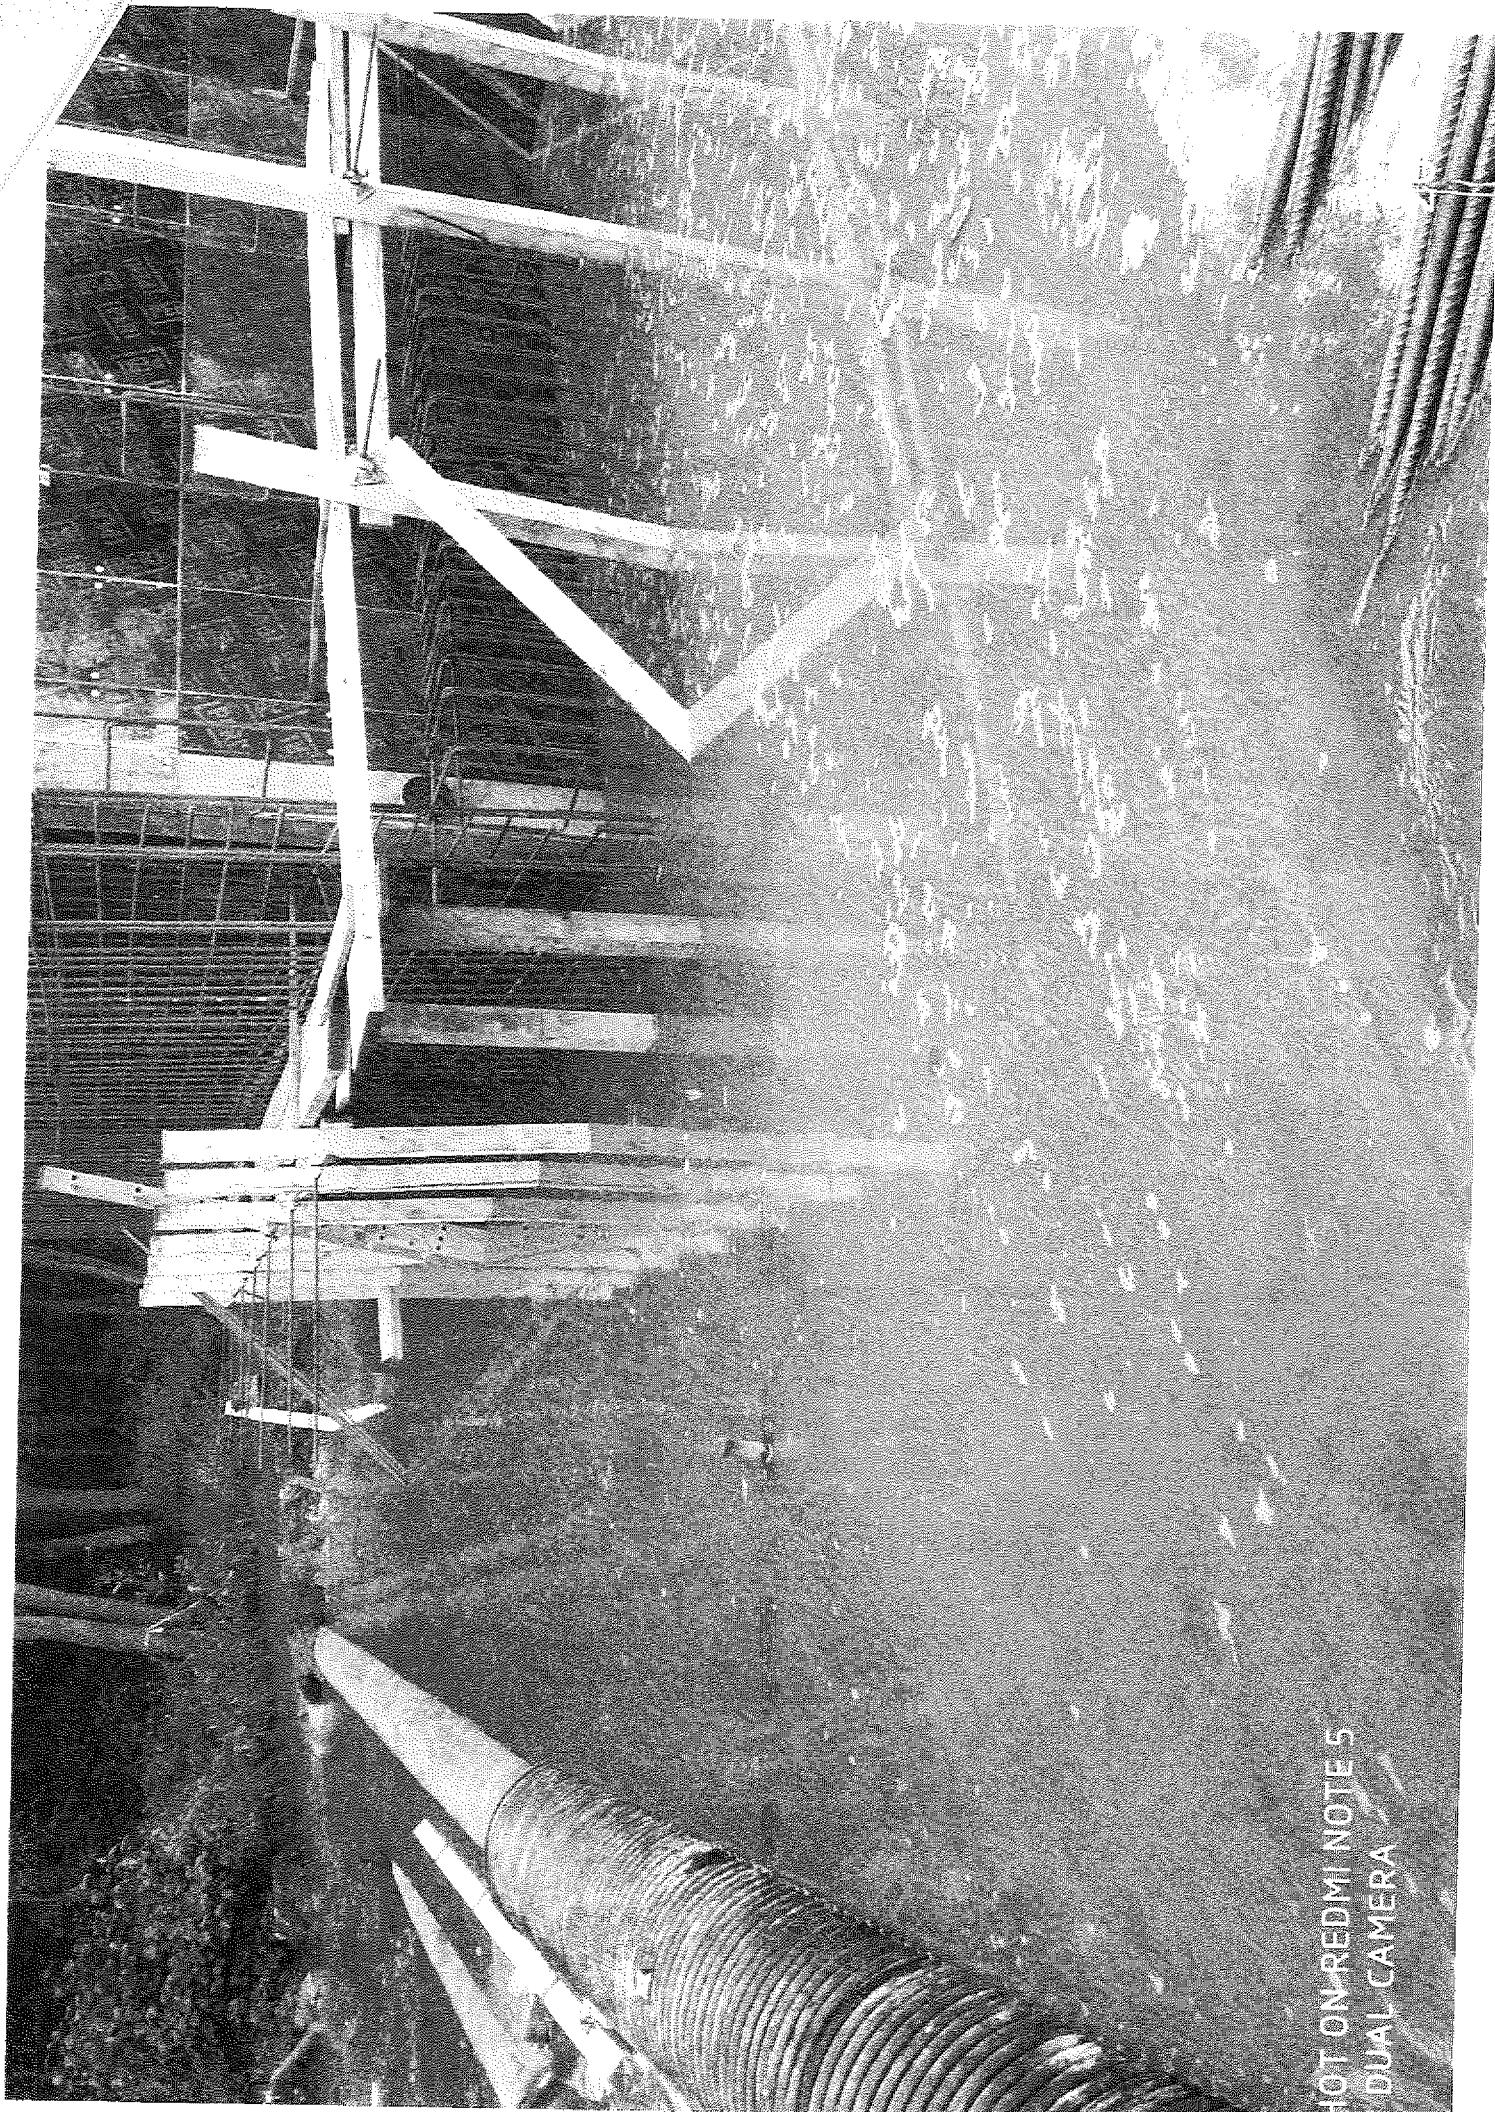

HOT ON REDMI NOTE 5
1 DUAL CAMERA
