

DODATEK Č. 3 K SMLOUVĚ O DÍLO

„III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3“

Číslo smlouvy objednatele: 108/2018/OŘP/D2/HB/S


Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2019-002a Číslo stavby zhotovitele: 924119002a

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
 Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
 Technický dozor: Ivo Toman, OSVČ
 Koordinátor BOZP: Ing. Marta Smerekovská, referent investiční výstavby
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 18330681/0100
 IČO: 00090450
 DIČ: CZ00090450
 Telefon: +420 567 117 158
 Fax: +420 567 117 198
 E-mail: ksusv@ksusv.cz
 Zřizovatel: Kraj Vysočina
 (dále jen „Objednatel“)



a

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod – ul. Mírová
vedoucí společník: M - SILNICE a.s.
 se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a
 Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva
 zapsán Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
 Kontaktní osoba: Ing. Milan Orlík, vedoucí OTO OZ STŘED
Doručovací adresa: M - SILNICE a.s., Resslova 959, 500 02 Hradec Králové
 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
 smluvních: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva a
 Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva za oba společníky na základě plné moci
 technických: Zdeněk Drtina, vedoucí provozu Havlíčkův Brod
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
 Č. účtu: 1080015329/0800

Dodatek č. 3 k SoD č. 108/2018/OŘP/D2/HB/S

Stránka 1 z 4
 M - SILNICE a.s.
 Pardubice, Husova 1697
 IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
 oblastní závod STŘED
 Za Pivovarem 611, 537 01 Hradec Králové

IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Telefon: +420 495 843 311
Fax: +420 495 843 320
E-mail: obchod@msilnice.cz

společník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupený: Petrem Suchým, předsedou představenstva
zapsán OR-KR v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
Kontaktní osoba: Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení
Doručovací adresa: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
technických: Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod
Č. účtu: 3925017/0300
IČO: 60932171
DIČ: CZ60932171
Telefon: +420 569 400 500
Fax: +420 569 400 500
E-mail: sekretariat@chladek-tintera.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 21. 1. 2019 spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

2.2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku VI.** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 4 o **646.509,26 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 4 o **– 803.986,10 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH, vč. Dodatku č. 2	37.287.825,00 Kč
Vícepráce	646.509,26 Kč
Méněpráce	<u>- 803.986,10 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 3 bez DPH	37.130.348,16 Kč
DPH 21%	7.797.373,11 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	44.927.721,27 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 108/2018/OŘP/D2/HB/S jsou tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 108/2018/OŘP/D2/HB/S uzavřené dne **21. 1. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 4, Změna k Dodatku č. 3 (Rekapitulace rozpočtu), Soupis prací pro Dodatek č. 3 (SO 101) a Vyjádření projektanta – změna 9 (ZL č. 4) – úprava materiálu povrchu křižovatky v km 0,690 (Termesivy) ze 17. 8. 2019.

Přílohy: Změnový list č. 4
Změna k Dodatku č. 3 (Rekapitulace rozpočtu)
Soupis prací pro Dodatek č. 3 (SO 101)
Vyjádření projektanta – změna 9 (ZL č. 4) – úprava materiálu povrchu křižovatky v km
0,690 (Termesivy) ze 17. 8. 2019

OBJEDNATEL: 5.11.2019
~~Zhotovitel:~~

ZHOTOVITEL: 5.11.2019
~~Objednatel:~~


V Jihlavě dne: 07. 11. 2019



Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

V Jihlavě dne: 04 -11- 2019



Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Mgr. Michal Kropáč
člen představenstva
M – SILNICE a.s.

Petr Suchý
předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

(23) Chládek
a Tintěra Havlíčkův Brod
Průmyslová 941
P.O. box 10 580 01
Havlíčkův Brod, tel./fax: 569 400 500
a.s. telefon: 569 425 220
telefon: 569 422 394
IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171

Změnový list

Název stavby: III/03810 HAVLÍČKŮV BROD - UL. MÍROVÁ, ÚSEK č.3 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 KOMUNIKACE III/03810	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101	Číslo Změny ZL 4
---	--	--------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2019 (dále jen Smlouva): č.obj. 108/2018/OŘP/D2/HB/S a č. zhotovitele 24-SOD-2019-002a a 18060/032 A

Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod – ul. Mírová, M - SILNICE a.s.Husova 1697, 530 03 Pardubice a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60932171

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek - ZBV 9	1	Správce stavby
Vyřádění projektanta, zdůvodnění	2	Zhotovitel
Výkresová dokumentace	3	Projektant
Protokoly, zápisy ze stavebního deníku		

Iniciátor změny: Investor - KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY

Popis Změny:

ZMĚNA 9 - úprava materiálu povrchu křižovatky v km 0,690 (Termesivy), odpočet úprava podloží,
Změny: Na základě doporučení od DIPČR bude provedena změna části povrchu křižovatky III/03813 směr na Termesivy.
Původní stav: částí nepevněné krajnice byly provedeny z kamenných kostek drobných.
Nastala obava, že drobná kostka nevydrží nápor návěsových souprav a docházelo by k častým opravám povrchu, z tohoto důvodu byla navržena změna: krajnice z kamenných kostek, bude nahrazena asfaltobetonem, asfaltobeton bude opatřen červeným nátěrem (protiskluzným), dále bude doplněno VDZ, nad křižovatkou dle požadavku PČR přidána 1 ks SDZ.
V úseku staničení km 0,270 - 0,420 snížení prováděné vrstvy stabilizace směsí z hydraulických pojiv z tl. 0,45m na 0,35m.
Upřesnění dojezdových vzdáleností uloženého frézovaného materiálu na jednotlivé skládky do 5 a 20ti km.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-803 986,10	646 509,26	-157 476,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno	Ing. Jiří Marek	datum	9.10.19	podpis	
Zhotovitel	Jméno	K. Bratrošovský	datum	9.10.19	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. M. Smerekovská	datum	11.10.19	podpis	
Správce stavby : TDI	Jméno	Ing. I. Toman	datum	9.10.19	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, dle čl. 6.2 a 6.3 SOD. Tento Změnový list je přílohou dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	Jméno	Ing. M. Smerekovská	datum	11.10.19	podpis	
Zhotovitel	Jméno	K. Bratrošovský	datum	9.10.19	podpis	
Číslo paré:						M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrást
(18)

REKAPITULACE ROZPOČTU

III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3

ZMĚNA k Dodatku č. 3

IČO : 42196868
DIČ : CZ42196868
IČO : 60932171
DIČ : CZ60932171
IČO : 00090450
DIČ : CZ00090450

M - SILNICE, a.s.
Reslsova 956, 500 02 Hradec Králové
Chládek a Tintáns Havlíčkův Brod, a.s.
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zhotovitel:

Objednatel:

P.č.	Název objektu	Celková cena	DPH	Cena bez DPH	Dodatek č. 1		Dodatek č. 2		Dodatek č. 3		Celkem	
					Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1	001.1 SO 001.1 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY		414 283,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 777,02	2 387 060,19
2	101 SO 101 - KOMUNIKACE III/03810		4 839 220,73		200 151,63	98 747,74	335 900,74	64 260,00	646 509,26	803 986,10	23 735 666,50	28 720 156,46
3	301.2 SO 301.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE		1 668 051,29		790 205,35	63 695,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 612,89	10 490 331,60
4	302.1 SO 302.1 - PŘELOŽKA KANALIZACE		155 666,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 269,50	896 936,10
5	302.2 SO 302.2 - ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET		102 732,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 200,09	591 932,11
6	501 SO 501 - PŘELOŽKA PLYNOVODU		42 028,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 133,49	242 161,52
7	801.1 SO 801.1 - NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV		53 993,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 110,87	311 104,15
8	901 SO 901 - NÁVRH OBJÍZDNÉ TRASY VČETNÉ DÍO		223 561,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 577,80	1 288 139,14
	CELKEM		7 599 536,46		990 366,76	162 441,37	339 900,74	64 260,00	646 509,26	803 986,10	37 130 348,16	44 927 721,27

Popis: Dodatek č.1

- Oprava obilných tras
- Přeložka vodovodu PLEAS, vč. zápnů
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE - odpočet drenáže
- Komunikace - úprava podloží km 0,420-0,700
- Dodatek č.2
- Komunikace - úprava podloží km 0,703-0,963
- Dodatek č.3
- Komunikace - úprava materiálu povrchu křižovatek v km 0,690 (Termesiv)
- Komunikace - úprava stabilizace v 0,270 - 0,419
- Komunikace - frézovaná odvoz dle skutečnosti na skládky na vzd. 5 a 20 km

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ4219686
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavb: 16026 III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3
Rozpč: 101 SO 101 - KOMUNIKACE III/03810 (JKSO 822 24)

				Dodatek č.1 Z1,Z12			
101		23 520 098,73		98 747,74		200 151,61	
				Méněpráce		Vícepráce	
Cena		Celkem		Cena Celkem		Cena Celkem	
Jednotková	9	Celkem	10	Počet jednotek	8	Počet jednotek	8
		1 524 782,37		0,00		6 671,43	
	212,00		753 614,63		0,00		3 554,71
	212,00		56 707,67		0,00		298,91
	851,00		42 039,40		0,00		49,40
	354,00		644 655,24		0,00		1 821,06
	110,00		27 765,43		0,00		252,41
		5 261 766,24		0,00		40 618,45	
	2 187,00		21 870,00		0,00		10,00
	6 841,00		54 728,00		0,00		8,00
	1 769,00		87 388,60		0,00		49,40
	455,00		828 582,30		0,00		1 821,06
	602,00		440 784,40		0,00		732,20
	957,00		700 715,40		0,00		732,20
	156,00		39 376,43		0,00		252,41
	310,00		690 705,11		0,00		2 228,08
	310,00		82 921,59		0,00		267,49
	993,00		245 832,05		0,00		247,56
	214,00		54 016,38		0,00		252,41
	1 019,00		1 099 643,66		0,00		1 079,14
	19,00		67 540,93		0,00		3 554,71
	19,00		5 082,29		0,00		267,49
	1 104,00		537 195,36		0,00		486,59
	19,00		148 384,30		0,00		9 942,20
	376,00		94 907,29		0,00		252,41
	20,00		33 655,00		0,00		1 682,75
	73,00		18 426,15		0,00		252,41
		1 628 581,35		0,00		0,00	
	1 437,00		851 494,35		0,00		592,55
	72,00		304 740,00		0,00		4 232,50
	279,00		472 347,00		0,00		1 693,00
		12 692 699,79		98 747,74		33 360,00	
	346,00		2 157 057,42		0,00		6 234,27
	399,00		78 343,65		0,00		196,35
	299,00		724 951,51		98 747,74		2 094,34
	997,00		266 686,53		0,00		267,49
	149,00		29 256,15		0,00		196,35
	249,00		1 552 333,23		0,00		6 234,27
	1 148,00		7 002,80		0,00		6,10
	1 148,00		37 281,30		0,00		32,47
	25,00		148 435,00		0,00		5 937,40
	16,00		212 780,80		0,00		13 298,80
	162,00		168 480,00		0,00		1 040,00
	302,00		2 223 142,80		0,00		7 361,40
	405,00		2 404 647,00		0,00		5 937,40
	315,00		1 870 281,00		0,00		5 937,40
	8 896,00		268 881,60		0,00		33 360,00
	1 637,00		306 119,00		0,00		187,00
	210,00		136 920,00		0,00		652,00
		1 034 932,00		0,00		0,00	
	765,00		150 705,00		0,00		197,00
	9 975,00		379 050,00		0,00		38,00
	5 142,00		195 396,00		0,00		38,00
	2 379,00		80 886,00		0,00		34,00
	2 379,00		90 402,00		0,00		38,00
	1 198,00		91 048,00		0,00		76,00
	5 512,00		44 096,00		0,00		8,00
	17,00		3 349,00		0,00		197,00
		1 487 447,98		0,00		0,00	
	510,00		12 240,00		0,00		24,00
	1 784,00		19 624,00		0,00		11,00
	3 144,00		34 584,00		0,00		11,00
	340,00		2 040,00		0,00		6,00
	544,00		193 120,00		0,00		355,00
	2 549,00		20 392,00		0,00		8,00
	623,00		67 284,00		0,00		108,00
	469,00		105 994,00		0,00		226,00
	4 270,00		42 700,00		0,00		10,00
	7 817,00		12 038,18		0,00		1,54
	578,00		376 856,00		0,00		652,00
	846,00		261 414,00		0,00		309,00
	4 285,00		107 125,00		0,00		25,00
	3,00		22 645,20		0,00		7 548,00
	4,00		29 445,60		0,00		7 361,40
	46,00		8 602,00		0,00		187,00
	1 877,00		22 524,00		0,00		12,00
	4 665,00		65 310,00		0,00		14,00
	345,00		34 335,00		0,00		63,00
	1 405,00		49 175,00		0,00		35,00
		0,00		0,00		118 601,73	
	25,20		0,00		0,00		2 132,00
	755,00		0,00		0,00		31,00
	109,20		0,00		0,00		31,00
	546,10		0,00		0,00		62,00
	136,50		0,00		0,00		31,00
	950,00		0,00		0,00	0,000	0,00

Dodatek č.2 ZL 3					Dodatek č.3				
64 260,00		335 900,74		23 893 199,00	803 986,10		646 509,26		23 735 722,16
Méněpráce		Vícepráce		Celkem po změně	Méněpráce		Vícepráce		Celkem po změně
Počet jednotek 8	Cena Celkem 9	Počet jednotek 8	Cena Celkem 9	Počet jednotek 8	Cena Celkem 9	Počet jednotek 8	Cena Celkem 9	Počet jednotek 8	Cena Celkem 9
0,00		46 301,01		1 577 755,75		3 625,20		9 540,00	1 683 670,55
0,00		218,40	46 301,01	3 773,187	799 916,49	17,10	3 625,20	45,00	9 540,00
0,00			0,00	298,958	63 379,52		0,00		0,00
0,00			0,00	49,400	42 039,40		0,00		0,00
0,00			0,00	1 821,060	644 655,24		0,00		0,00
0,00			0,00	252,413	27 765,10		0,00		0,00
0,00			71 853,83	5 364 130,22			550 503,90		352 653,26
0,00			0,00	10,000	21 870,00		0,00		0,00
0,00			0,00	8,000	54 728,00		0,00		0,00
0,00			0,00	49,400	87 388,60		0,00		0,00
0,00			0,00	1 821,060	828 582,30		0,00		0,00
0,00			0,00	732,200	440 784,40		0,00		0,00
0,00			0,00	732,200	700 715,40		545 202,90		0,00
0,00			0,00	252,413	39 375,96		0,00		0,00
0,00		218,40	67 704,31	2 446,482	758 409,11	17,10	5 301,00	45,00	13 950,00
0,00			0,00	267,489	82 921,90		0,00		0,00
0,00			0,00	247,565	245 837,01		0,00		0,00
0,00			0,00	252,413	54 015,74		0,00		0,00
0,00			0,00	1 079,140	1 099 643,66		0,00		0,00
0,00		218,40	4 149,62	3 773,187	71 690,63		0,00		0,00
0,00			0,00	267,489	5 082,31		0,00		0,00
0,00			0,00	486,590	537 195,36		0,00		0,00
0,00			0,00	9 942,250	188 902,75		0,00		0,00
0,00			0,00	252,413	94 906,16		0,00		0,00
0,00			0,00	1 682,750	33 655,00		0,00		0,00
0,00			0,00	252,413	18 425,93		0,00		0,00
64 260,00			0,00	1 564 321,35			0,00		0,00
0,00			0,00	592,550	851 494,35		0,00		0,00
350,00	25 200,00		0,00	3 882,500	279 540,00		0,00		0,00
140,00	39 060,00		0,00	1 553,000	433 287,00		0,00		0,00
0,00		217 745,80		12 745 009,97			249 857,00		194 040,00
0,00		0,00		6 234,270	2 157 057,42		0,00	90,00	31 140,00
0,00		0,00		196,350	78 343,65	90,00	35 910,00		0,00
0,00		0,00		2 094,327	626 204,67		30 797,00		0,00
0,00	218,40	217 745,80		485,890	484 433,33		0,00		0,00
0,00		0,00		196,350	29 256,15	90,00	13 410,00		0,00
0,00		0,00		6 234,270	1 552 333,23	90,00	22 410,00	270,00	67 230,00
0,00		0,00		6,100	7 002,80		0,00		0,00
0,00		0,00		32,475	37 287,04		0,00		0,00
0,00		0,00		5 937,400	148 435,00		0,00	90,00	2 250,00
0,00		0,00		13 298,800	212 780,80		0,00	90,00	1 440,00
0,00		0,00		1 040,000	168 480,00		0,00		0,00
0,00		0,00		7 361,400	2 223 142,80		0,00	90,00	27 180,00
0,00		0,00		5 937,400	2 404 647,00		0,00	90,00	36 450,00
0,00		0,00		5 937,400	1 870 281,00		0,00	90,00	28 350,00
0,00		0,00		33,975	302 286,08		0,00		0,00
0,00		0,00		187,000	306 119,00	90,00	147 330,00		0,00
0,00		0,00		652,000	136 920,00		0,00		0,00
0,00		0,00		1 034 932,00			0,00		0,00
0,00		0,00		197,000	150 705,00		0,00		0,00
0,00		0,00		38,000	379 050,00		0,00		0,00
0,00		0,00		38,000	195 396,00		0,00		0,00
0,00		0,00		34,000	80 886,00		0,00		0,00
0,00		0,00		38,000	90 402,00		0,00		0,00
0,00		0,00		76,000	91 048,00		0,00		0,00
0,00		0,00		8,000	44 096,00		0,00		0,00
0,00		0,00		197,000	3 349,00		0,00		0,00
0,00		0,00		1 487 447,88			0,00		0,00
0,00		0,00		24,000	12 240,00		0,00		0,00
0,00		0,00		11,000	19 624,00		0,00	1,00	1 784,00
0,00		0,00		11,000	34 584,00		0,00		0,00
0,00		0,00		6,000	2 040,00		0,00		0,00
0,00		0,00		355,000	193 120,00		0,00	5,50	2 992,00
0,00		0,00		8,000	20 392,00		0,00		0,00
0,00		0,00		108,000	67 284,00		0,00		0,00
0,00		0,00		226,000	105 994,00		0,00		0,00
0,00		0,00		10,000	42 700,00		0,00		0,00
0,00		0,00		1,540	12 038,18		0,00		0,00
0,00		0,00		652,000	376 856,00		0,00		0,00
0,00		0,00		309,000	261 414,00		0,00		0,00
0,00		0,00		25,000	107 125,00		0,00		0,00
0,00		0,00		7 548,400	22 645,20		0,00		0,00
0,00		0,00		7 361,400	29 445,60		0,00		0,00
0,00		0,00		187,000	8 602,00		0,00		0,00
0,00		0,00		12,000	22 524,00		0,00		0,00
0,00		0,00		14,000	65 310,00		0,00		0,00
0,00		0,00		63,000	34 335,00		0,00		0,00
0,00		0,00		35,000	49 175,00		0,00		0,00
0,00		0,00		119 601,73			0,00		85 500,00
0,00		0,00		2 132,550	53 740,26		0,00		0,00
0,00		0,00		31,469	23 759,10		0,00		0,00
0,00		0,00		31,469	3 436,41		0,00		0,00
0,00		0,00		62,938	34 370,44		0,00		0,00
0,00		0,00		31,469	4 295,52		0,00		0,00
0,00		0,00		0,000	0,00		0,00	90,00	85 500,00



Havlíčkův Brod s.r.o.
Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův Brod

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
VYSOČINY
Ing. Marta Smerekovská

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Havlíčkův Brod dne
17. 8. 2019

**Věc: Vyjádření projektanta – ZMĚNA 9 - úprava materiálu povrchu
křižovatky v km 0,690 (Termesivy). ZL 4**

Vyjádření ke změně číslo 7. Jedná se o akci:

„III/03810 HAVLÍČKŮV BROD - UL. MÍROVÁ, ÚSEK č.3“

Změny: Změny: Na základě doporučení od DIPČR bude provedena změna části povrchu křižovatky III/03813 směr na Termesivy.

Původní stav: Části nezpevněné krajnice byly provedeny z kamenných kostek drobných.

Nastala obava, že drobná kostka nevydrží nápor návěsových souprav a docházelo by k častým opravám povrchu, z tohoto důvodu byla navržena změna: krajnice z kamenných kostek, bude nahrazena asfaltobetonem, asfaltobeton bude opatřen červeným nátěrem (protiskluzným), dále bude doplněno VDZ, nad křižovatkou dle požadavku PČR přidána 1 ks SDZ.

V úseku staničení km 0,270 - 0,420 snížení prováděné vrstvy stabilizace směsí z hydraulických pojiv z tl. 0,45m na 0,35m.

Upřesnění dojezdových vzdáleností uloženého frézovaného materiálu na jednotlivé skládky do 5 a 20ti km..

POLOŽKY PLUS a MINUS jsou vyčísleny v příloze.

S pozdravem

DMC®
Havlíčkův Brod s.r.o.
Průmyslová 941 IČO: 252 84 525
580 01 Havlíčkův Brod DIČ: CZ25284525
profesionálním pozdravem
Ing. Jiří Marek
-projekce-
Tel.: 569 400 525
Fax: 569 400 501
Mob: 602 234 377
Email: marek@dmchb.cz

E-mail: marek@dmchb.cz, kverek@dmchb.cz
IČ: 25284525, DIČ: CZ25284525
Reg.: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 12926


Bankovní spojení
ČSOB Havlíčkův Brod
číslo účtu: 181587751/0300

Tel.: Marek -569 400 525, 602 234 377

Tel.: Kverek -569 400 512, 602 234 377

DMC a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘEL
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

PŮVODNÍ STAV:

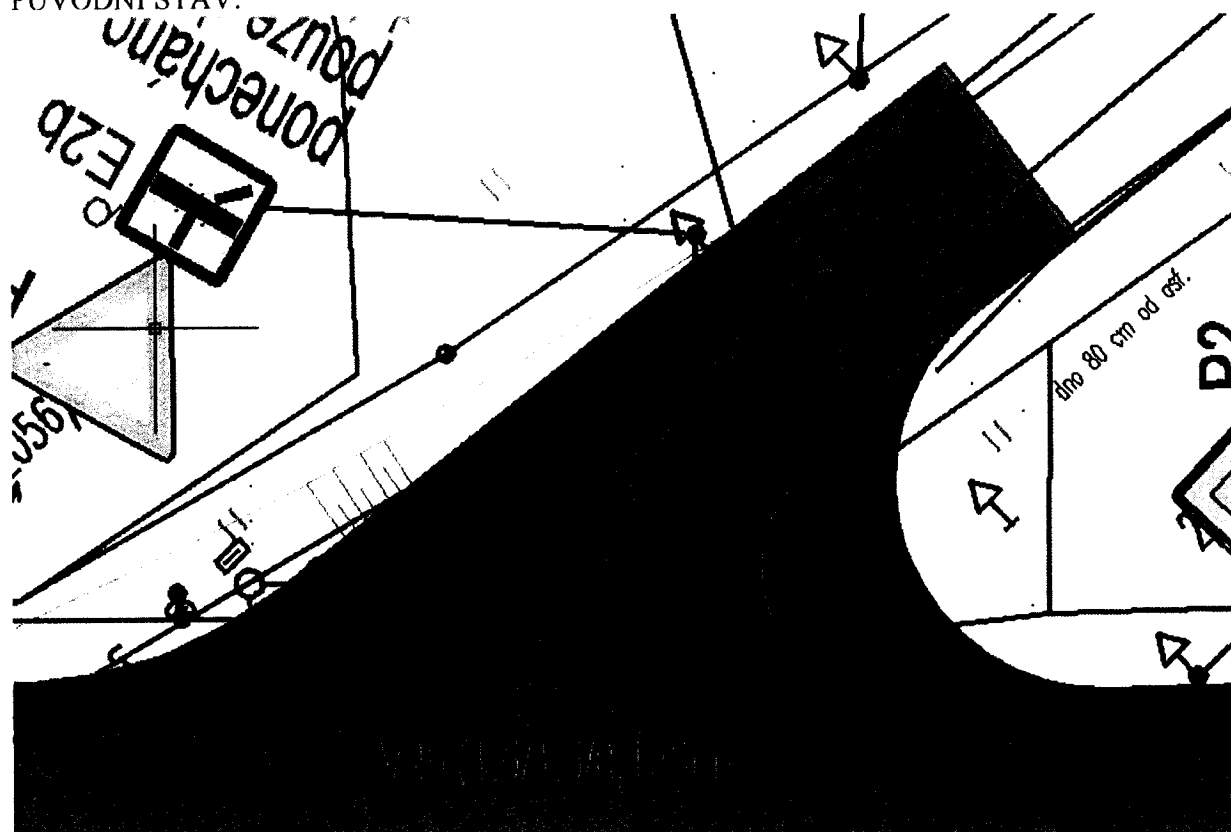

ZMĚNA:

