

**DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO****„III/3469 Chotěboř – Nejepín – Vepříkov – křiž. III/34610“**

Číslo smlouvy objednatele: 147/2019/MINI/SFDI/OŘN/HB/S

Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo stavby: 924 119 120; Číslo smlouvy: 24-SOD-2019-120

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1****Smluvní strany**

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
smluvních: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace  
technických: Ing. Josef Bernad, referent přípravy a realizace staveb  
Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek  
Technický dozor: Václav Švoma, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor,  
Žďár nad Sázavou  
Koordinátor BOZP: Václav Švoma, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor,  
Žďár nad Sázavou  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: 567 117 158  
Fax: 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „*Objednatel*“)

**a**

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.  
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
**zastoupený:** Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva na  
základě písemného pověření představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva  
technických: Zdeněk Drtina, vedoucí provozu Havlíčkův Brod  
Jiří Marek, stavbyvedoucí  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 1080015329/0800

IČO: 42196868  
DIČ: CZ42196868  
Telefon: 495 843 311  
Fax: 495 843 320  
E-mail: obchod@msilnice.cz

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

## Článek 2

### Změna smluvních podmínek

**2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **2. 8. 2019** spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

**2.2.** Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovými listy č. 1, 2 a 3 vč. Změnových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

**2.3.** Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

**navýšena o cenu víceprací** na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 3 o **27.460,97 Kč bez DPH**

**a snížena o cenu méněprací** na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **- 48.000,00 Kč bez DPH**

b) dle Změnového listu č. 1 o **- 5.614,00 Kč bez DPH**

c) dle Změnového listu č. 2 o **- 38.399,00 Kč bez DPH**

<b>Původní cena díla bez DPH</b>	<b>19.899.921,28 Kč</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>27.460,97 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>- 92.013,00 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>19.835.369,25 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>4.165.427,54 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena včetně DPH</b>	<b>24.000.796,79 Kč</b>

**2.4.** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 147/2019/MINI/SFDI/OŘN/HB/S nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

## Článek 3

### Ostatní ujednání

**3.1.** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 147/2019/MINI/SFDI/OŘN/HB/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

**3.2.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 117/2019/MINI/SFDI/OŘN/PE/S uzavřené dne **2. 8. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**3.3.** Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

**3.4.** Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

**3.5.** Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

**3.6.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

**3.7.** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

**3.8.** Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1, 2 a 3 vč. Změnových rozpočtů


Přílohy:            Změnový list č. 1 vč. Změnového rozpočtu  
                      Změnový list č. 2 vč. Změnového rozpočtu  
                      Změnový list č. 3 vč. Změnového rozpočtu

V Hradci Králové

V Jihlavě

Zhotovitel:

Objednatel:

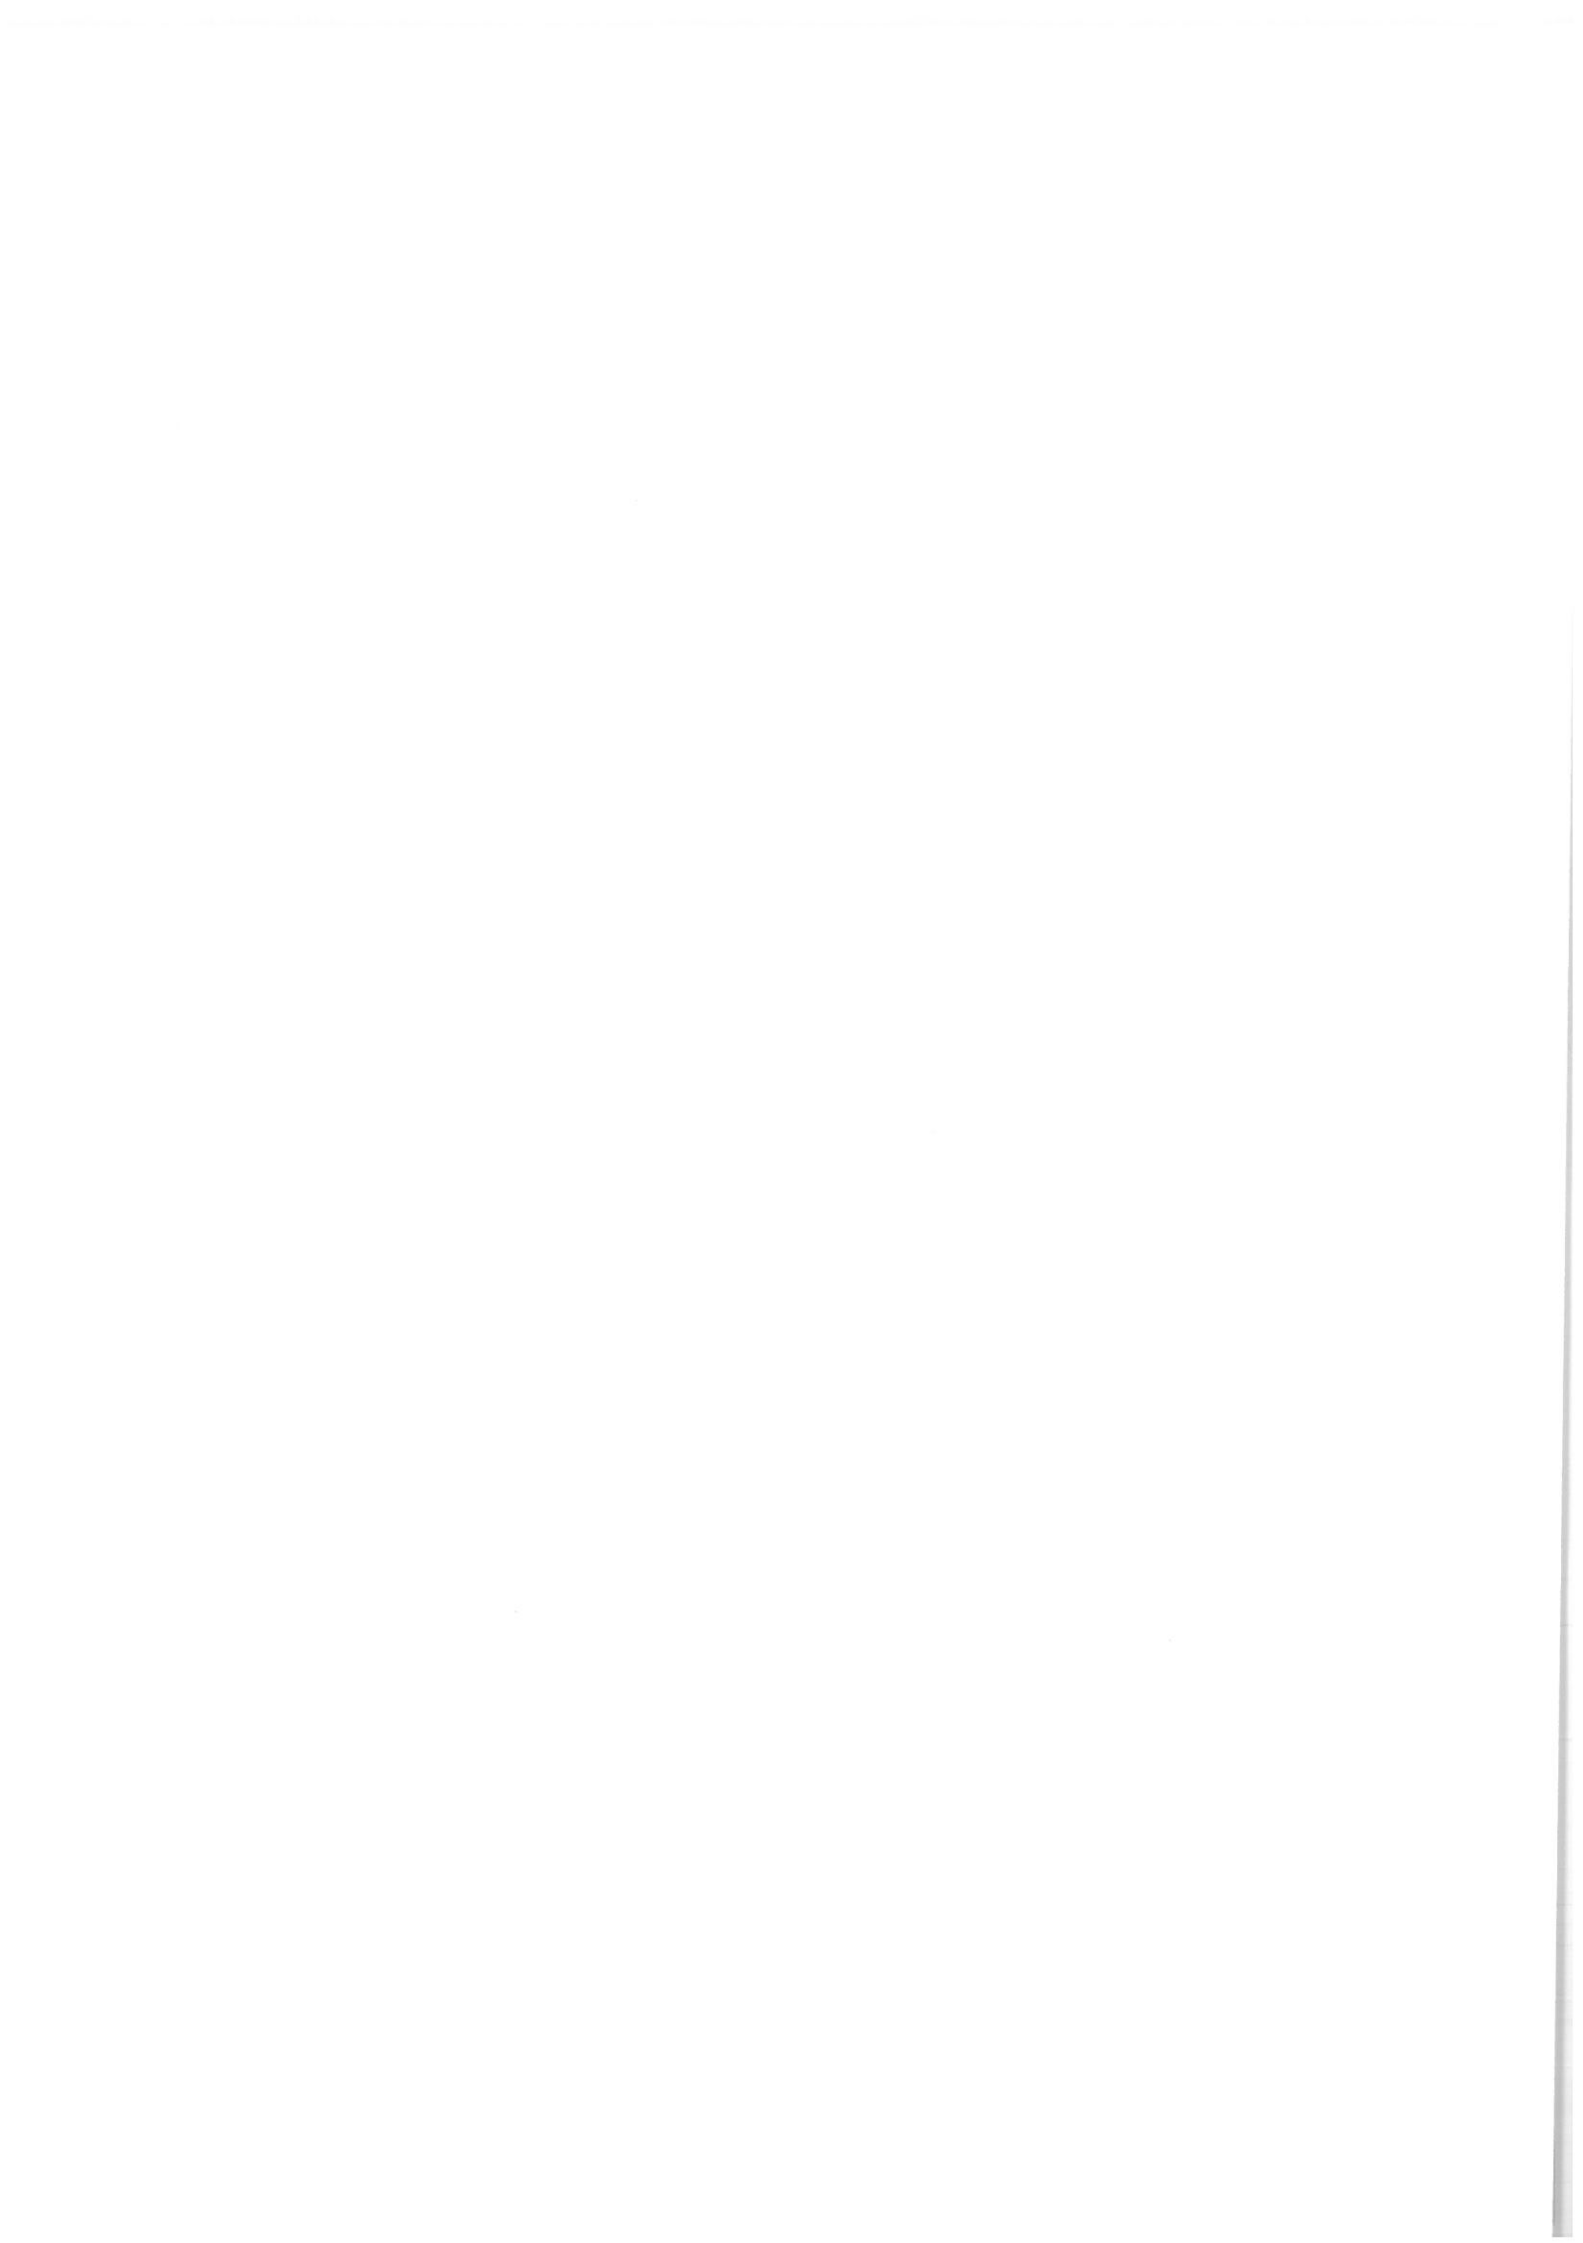



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/3469 Chotěboř-Nejepín-Vepřikov-kříž. 34610  
924119120  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000.2  
Vedlejší a ostatní náklady (pro objekty SO 102)

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:  
**SO 000.2**

Číslo ZBV:  
**1**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Vyhotovení Příjemce

2x Objednatel

2x Zhotovitel

Iniciátor změny: objednatel





Popis Změny:

Položka č. 23 - RDS nebylo třeba zpracovávat



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 000,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	Bc. Petr Jaroš	datum	5.9.2019	podpis	
Technický dozor objednatele	jméno	Václav Švoma	datum	5.9.2019	podpis	
Vyjádření objednatele	jméno	Ing. Tomáš Mátl	datum	5.9.19	podpis	
Vyjádření zhotovitele	jméno	Jiří Marek	datum	5.9.2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radovan Necid	datum	5.9.2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka	datum	5.9.19	podpis	

**Položky změny stavby č. ZBV č.1**

**Stavba:** N24290134, Chotěboř - III/3469 Chotěboř - Nejezin - Vepříkov - III/34610 - KSUS Vysočiny  
**Objekt:** SO 000.2, Vedlejší a ostatní náklady (pro objekty SO 102)  
**Rozpočet:** SO 000.2, Vedlejší a ostatní náklady (pro objekty SO 102)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	2 - Základy					
23		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	-1,000	48 000,00	-48 000,00
		-1*1=-1,000 [A] neprovádělo se				
<b>Celkem</b>						<b>-48 000,00</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>-48 000,00</b>

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/3469 Chotěboř-Nejepín-Vepřívok-kříž. 34610 924119120	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 102</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Silnice III/3469 km 1,407 - km 4,540		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):  
Objednatel: KSÚS Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Vyhotovení	Příjemce
	2x	Objednatel
	2x	Zhotovitel

Iniciátor změny: objednatel





Popis Změny:

Položky č. 103,104,283 - skutečný stav - schváleno TDI  
Položky č. 289,419 - neprováděly se  
Položky č. 167, 170 - nové položky dle Rámcové smlouvy - skutečné provedení schválené TDI



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-5 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 614,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	Bc. Petr Jaroš	datum	5.7.2019	podpis	
Technický dozor objednatele	jméno	Václav Švoma	datum	5.9.2019	podpis	
Vyjádření objednatele	jméno	Ing. Tomáš Mátl	datum	5.9.19	podpis	
Vyjádření zhotovitele	jméno	Jiří Marek	datum	5.9.2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radovan Necid	datum	5.9.2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka	datum	5.9.19	podpis	

## Položky změny stavby č. ZBV č. 1

**Stavba:** N24290134, Chotěboř - III/3469 Chotěboř - Nejezin - Vepřkov - III/34610 - KSUS Vysočiny  
**Objekt:** SO 102, silnice III/3469 km 0,407 - km 4,540  
**Rozpočet:** SO 102, silnice III/3469 km 0,407 - km 4,540


Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
103 12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	22,000	532,00	11 704,00
		22*1=22,000 [A] <i>skutečný stav</i>				
104 129971		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	-2,000	630,00	-1 260,00
		-2*1=-2,000 [A] <i>skutečný stav</i>				
<b>Celkem</b>						
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						
283 626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL. 20MM	M2	18,000	1 345,00	24 210,00
		48-30=18,000 [A] <i>dle geodetického zaměření</i>				
289 62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	-40,000	450,00	-18 000,00
		-40*1=-40,000 [A] <i>neprovádělo se</i>				
<b>Celkem</b>						
<b>91 - Doplňující konstrukce a práce</b>						
419 91856		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	-2,000	24 700,00	-49 400,00
		-2*1=-2,000 [A] <i>neprovádělo se</i>				
<b>Celkem</b>						
<b>991 - Svislé konstrukce</b>						
167 317324	N	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	2,800	8 970,00	25 116,00
<b>Celkem</b>						
<b>-49 400,00</b>						



**Položky změny stavby č. ZBV č. 1**

**Stavba:** N24290134, Chotěboř - III/3469 Chotěboř - Nejeptín - Vepřkov - III/34610 - KSUS Výsočiny  
**Objekt:** SO 102, silnice III/3469 km 0,407 - km 4,540  
**Rozpočet:** SO 102, silnice III/3469 km 0,407 - km 4,540

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
170 317366	N	2,8*J=2,800 [A] nová položka dle RS - skutečné provedení schváleno TDI VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ	T	0,080	25 200,00	2 016,00
		0,08*J=0,080 [A] Nová položka dle RS - skutečné provedení schváleno TDI				
<b>Celkem</b>						<b>27 132,00</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>-5 614,00</b>

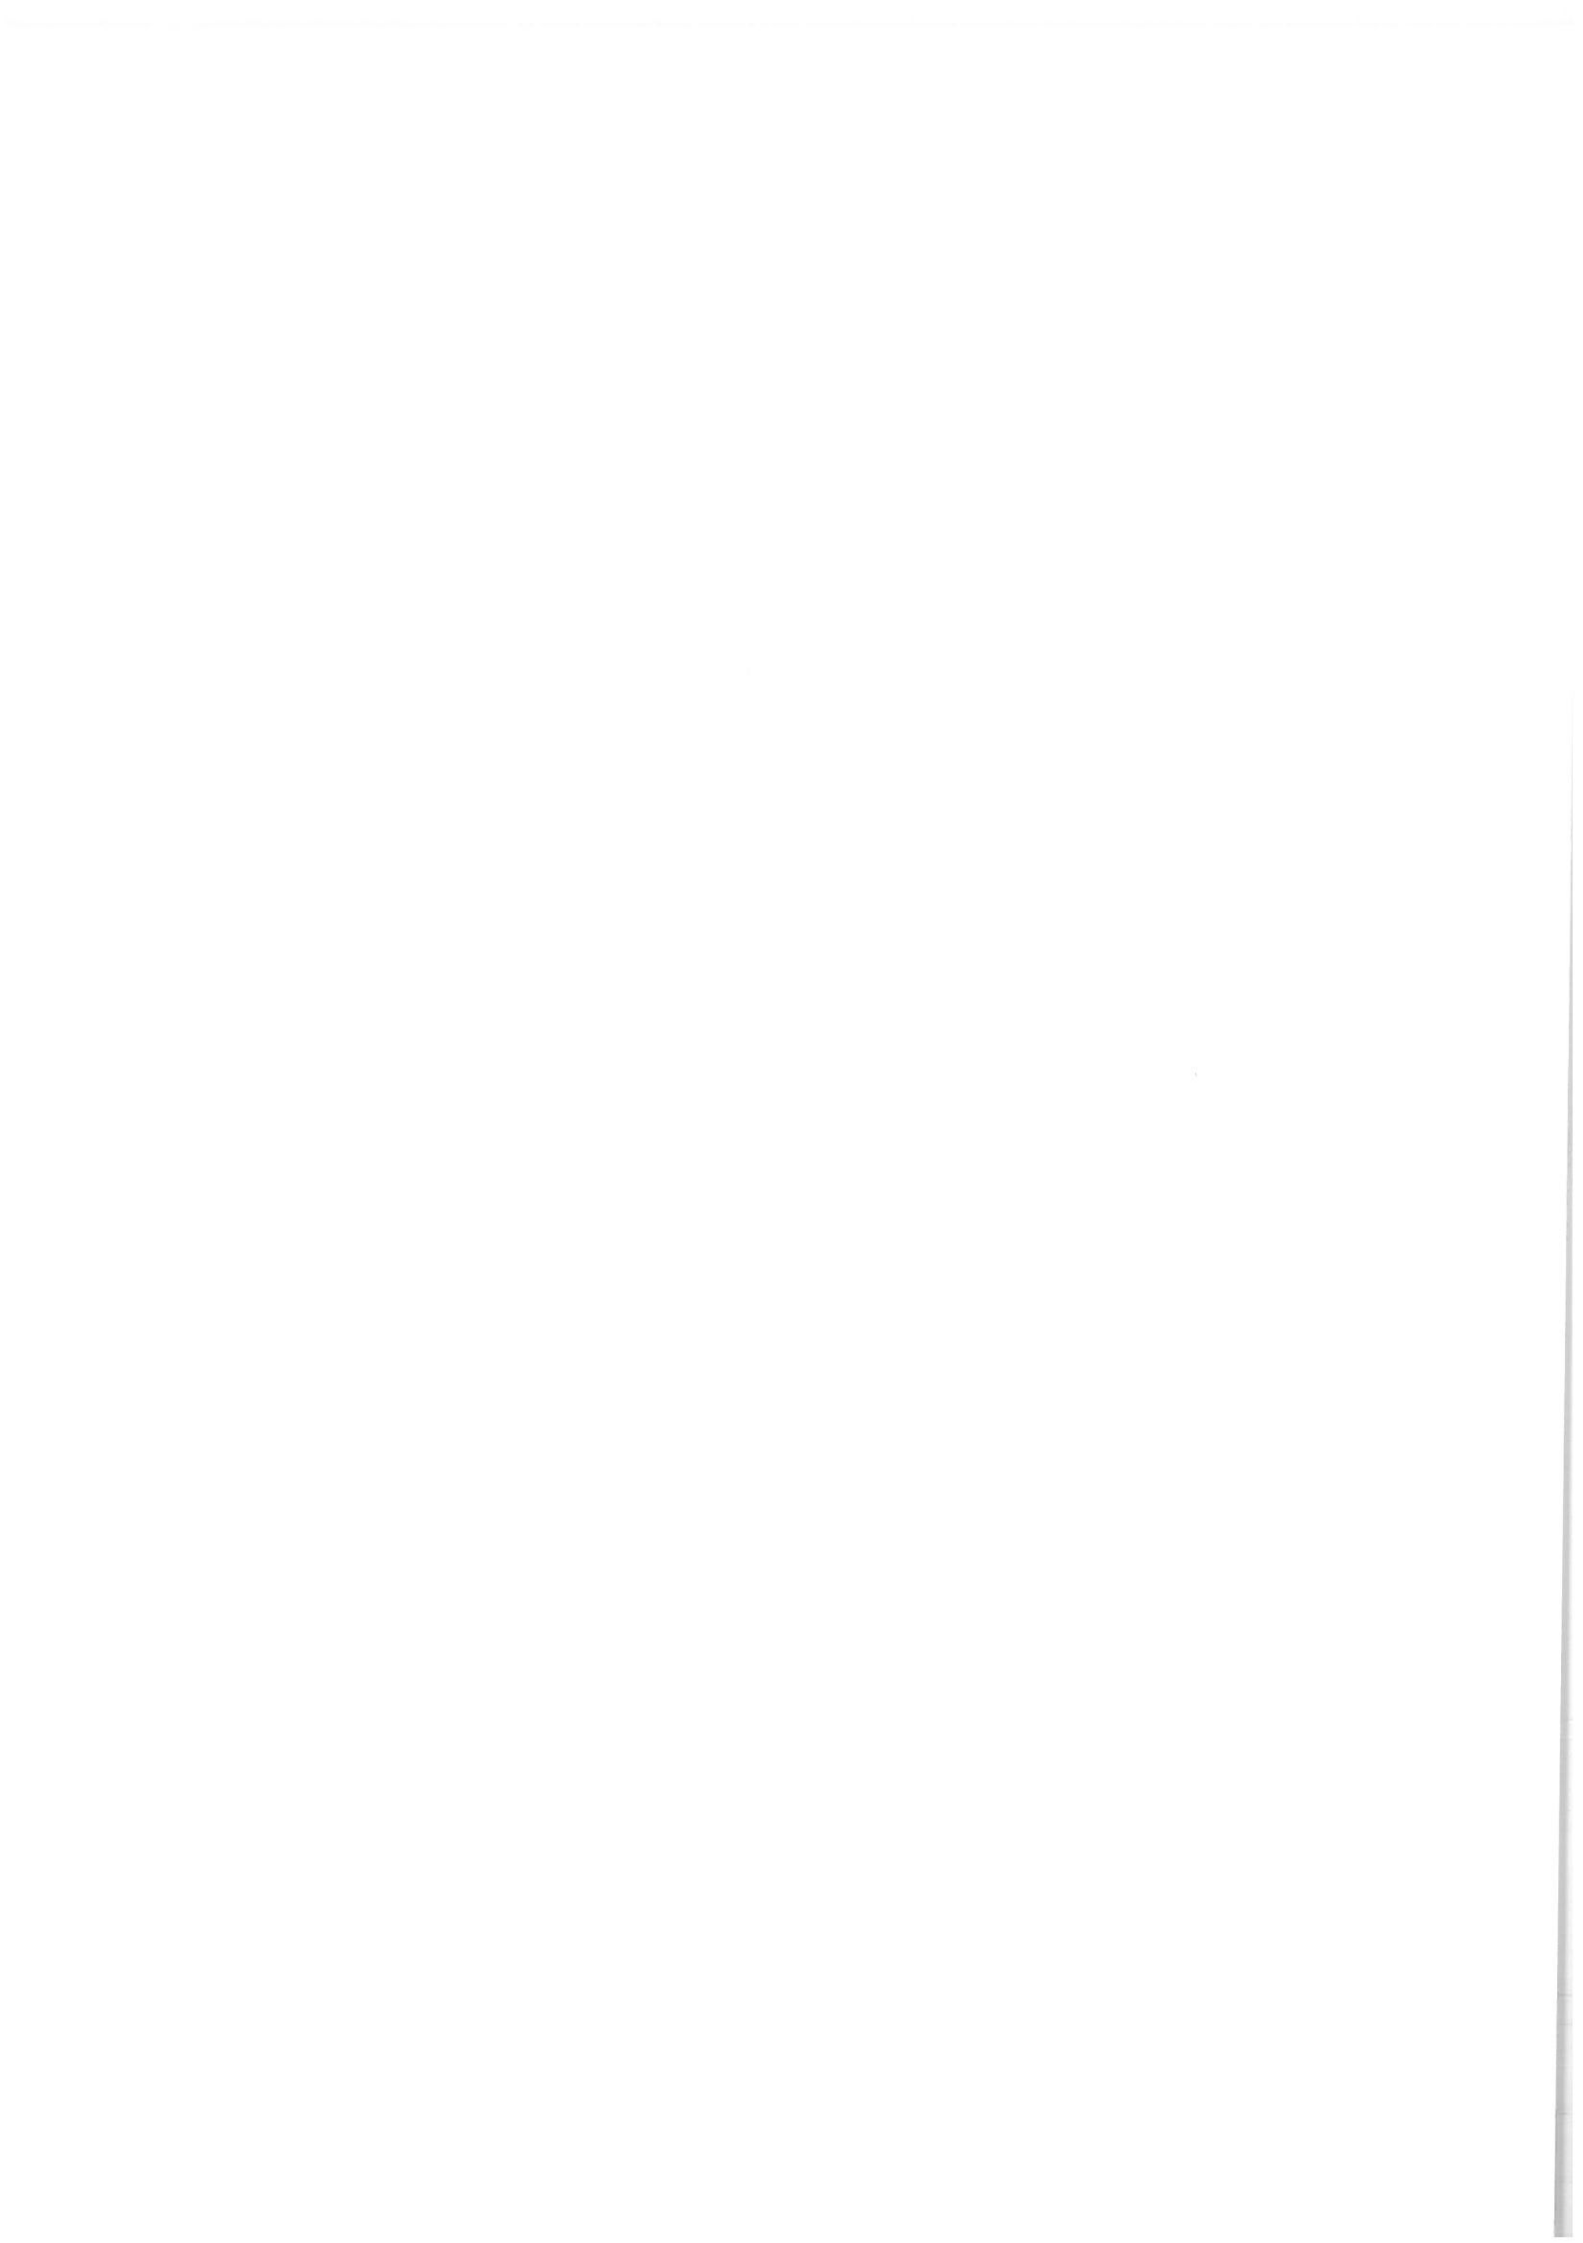

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/3469 Chotěboř-Nejepín-Vepřikov-kříž. 34610

924119120

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102

Silnice III/3469 km 1,407 - km 4,540

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 102

Číslo ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

## Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Vyhotovení Příjemce

2x Objednatel

2x Zhotovitel

Iniciátor změny: objednatel

Popis Změny:





Položka č. 197, 323 - skutečný stav - schváleno TDI

Položka č. 198 - neprováděla se

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-38 399,00	0,00	-38 399,00

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Bc. Petr Jaroš	datum	10.10.2019	podpis	
Technický dozor objednatele	jméno	Václav Švoma	datum	10.10.2019	podpis	
Vyjádření objednatele	jméno	Ing. Tomáš Mátl	datum	10.10.19	podpis	
Vyjádření zhotovitele	jméno	Jiří Marek	datum	10.10.2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radovan Necid	datum	10.10.2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka	datum	10.10.19	podpis	

## Položky změny stavby č. ZBV č. 2

**Stavba:** N24290134, Chotěboř - III/3469 Chotěboř - Nejeptín - Vepřkov - III/34610 - KSUS Vysočina  
**Objekt:** SO 102, silnice III/3469 km 0,407 - km 4,540  
**Rozpočet:** SO 102, silnice III/3469 km 0,407 - km 4,540

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4 - Vodovorné konstrukce						
197 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,800	4 090,00	19 632,00
		4,8*I=4,800 [A] <i>skutečný stav - schváleno TDI</i>				
198 465513		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	-10,000	2 337,60	-23 376,00
		-10*I=-10,000 [A] <i>neprovádělo se</i>				
			<b>Celkem</b>			<b>-3 744,00</b>
8 - Potrubí						
323 899523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	-14,500	2 390,00	-34 655,00
		5,5-20=-14,500 [A] <i>skutečný stav - schváleno TDI</i>				
			<b>Celkem</b>			<b>-34 655,00</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>-38 399,00</b>



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/3469 Chotěboř-Nejepín-Vepřikov-kříž. 34610 924119120	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 102</b>	Číslo ZBV: <b>3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Silnice III/3469 km 1,407 - km 4,540		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Vyhotovení	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	2x	Objednatel
	2x	Zhotovitel

Iniciátor změny: objednatel





Popis Změny:

Položka č. 281,358,421 - skutečný stav - schváleno TDI  
 Položky č. 128,229,231,242,247 - dle geodetického zaměření  
 Položka č. 220 - dle zaměření ACL  
 Položky č. 365,374 - nové položky dle Rámcové smlouvy - skutečné provedení schváleno TDI



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>27 460,97</b>	<b>27 460,97</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Bc. Petr Jaroš	datum	20.11.2019	podpis	
Technický dozor objednatele	jméno	Václav Švoma	datum	20.11.2019	podpis	
Vyjádření objednatele	jméno	Ing. Tomáš Mátl	datum	20.11.19	podpis	
Vyjádření zhotovitele	jméno	Jiří Marek	datum	20.11.	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radovan Necid	datum	20.11.2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka	datum	20.11.19	podpis	

### Položky změny stavby č. ZBV č. 3

**Stavba:** N24290134, Chotěboř - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - KSUS Vysočiny  
**Objekt:** SO 102, silnice III/3469 km 0,407 - km 4,540  
**Rozpočet:** SO 102, silnice III/3469 km 0,407 - km 4,540

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
128 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	126,600	12,74	1 612,88
		126,6*1=126,600 [A] dle geodetického zaměření sanace+sjezdy 3 980+155,6+141=4276,6m2				
			<b>Celkem</b>			<b>1 612,88</b>
<b>5 - Komunikace</b>						
220 567541		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	27,770	273,00	7 581,21
229 572123		4122,7*0,1+22747-23131,5=27,770 [A] dle zaměření ACL INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	184,400	14,00	2 581,60
231 572213		22747+155,6-22718,2=184,400 [A] dle geodetického zaměření SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	56,900	10,00	569,00
242 574A34		22619,5+155,6-22718,2=56,900 [A] dle geodetického zaměření ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	370,200	175,00	64 785,00
247 574C46		22619,5-22404,9+155,6=370,200 [A] dle geodetického zaměření ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	84,400	188,00	15 867,20
281 58910		22747-22818,2+155,6=84,400 [A] dle geodetického zaměření VÝPLŇ SPAR ASFALTEM 117-400=- 283,000 [A]	M	-283,000	83,00	-23 489,00



### Položky změny stavby č. ZBV č. 3

**Stavba:** N24290134, Chotěboř - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepřkov - III/34610 - KSUS Vysočiny

**Objekt:** SO 102, silnice III/3469 km 0,407 - km 4,540

**Rozpočet:** SO 102, silnice III/3469 km 0,407 - km 4,540

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>skutečný stav - schváleno TDI</i>						
91 - Doplnující konstrukce a práce				<b>Celkem</b>		<b>67 895,01</b>
358 91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČEITNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	-50,000	290,00	-14 500,00
		220-270=-50,000 [A]				
		<i>skutečný stav - schváleno TDI</i>				
365 914121	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ I - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 683,00	3 366,00
		2*I=2,000 [A]				
		<i>nová položka dle RS (skutečné provedení schváleno TDI)</i>				
374 914921	N	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 250,00	2 500,00
		2*I=2,000 [A]				
		<i>nová položka dle RS (skutečné provedení schváleno TDI)</i>				
421 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	-383,000	87,24	-33 412,92
		117-500=-383,000 [A]				
		<i>skutečný stav - schváleno TDI</i>				
<b>Celkem</b>						<b>-42 046,92</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>27 460,97</b>

