



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



KUJIP012TCYU


Kraj Vysočina

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 19. 3. 2015 na akci

„Úspory energií – Akademie-VOŠ, gymn. a SOŠ – internát Světlá nad Sázavou“

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kalina
tel.: +420 564602419
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4200511030/6800

Zhotovitel: Stavointerier s.r.o.
Se sídlem: Kozí 201, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený: Pavlem Blažkem – jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické: Vít Arbelovský
hlavní stavbyvedoucí AO: Vít Arbelovský
tel./fax: 777262815
IČO: 25943367
DIČ: CZ25943367
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 78-7810540297/0100
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vl. 16578

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 3. 2015 je změna předmětu díla, termínu dokončení a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce Úspory energií – Akademie-VOŠ, gymn. a SOŠ – internát Světlá nad Sázavou.

Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.3. a 13.1. této Smlouvy na uzavření Dodatku č. 1, který se mění ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Čl. 2. Předmět díla

Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 01, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. 4. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 4.3. se mění a nově zní takto:

Předmět díla bude dokončen nejpozději: 04.11.2015

Čl. 5. Cena za dílo, odst. 5.2. se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1

Cena bez DPH:

17 823 551,98 Kč

DPH 21 %:

3 742 945,92 Kč

Cena celkem s DPH činí:

21 566 497,90 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH:

88 098,42 Kč

Cena méněprací bez DPH:

- 144 473,00 Kč

Cena celkem vícepráce – méněpráce bez DPH:

- 56 374,58 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH:

17 767 177,40 Kč

DPH (21%):

3 731 107,25 Kč

Cena díla celkem s DPH:

21 498 284,65 Kč

Slovy: Dvacetjednamilionůčtyřístadevadesátosmtisícdevětšestosmdesátčtyři,65/100 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příloženém změnovém rozpočtu.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Změnový list č. 01

Položkový rozpočet změn

V Jihlavě, dne 2. 8. 09. 2015

V Havlíčkově Brodě, dne 2. 8. 09. 2015

Za Objednatele:

za Zhotovitele:

Kra Vysočina

Žitkova 57, 587 33 Jihlava

5

Ing. Libor Joukl

náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

Pavel Blažek
jednatel

STAVO

STAVOINTERIER s.r.o.
Kozí 201

580 01 Havlíčkův Brod
tel./fax: 569 420 256

INTERIER®

③

IČO 25943367
DIČ CZ25943367

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Stavointerier s.r.o., Kozí 201, PSČ 580 01, Havlíčkův Brod, IČO 259 43 367,	
Změnový list vystavil:	Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33; IČO:70890749	
Datum:	17.09.2015	
Název akce: Úspory energií - Akademie - VOŠ, gymn. a SOŠ - internát Světlá nad Sázavou		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny:		
<u>1. Posunutí termínu dokončení akce</u>		
Firma Stavointerier s.r.o. žádá prodloužení termínu dokončení akce o 35 kalendářních dní, t.j. posunout konečný termín na 4.11.2015.		
Letošní abnormálně teplé léto dlouhodobě přineslo velmi vysoké teploty. Venkovní omítky jsou navrženy jako tenkovrstvá vyztužená omítka. Technologický postup provádění těchto omítek nedovoluje nanášet lepidlo při teplotách vyšších než 25°C. Takových dnů bylo ve Světlé nad Sázavou v červenci až září 2015 třicet devět (39). Vzhledem k tomu, že harmonogram realizace byl nastaven na krizovou cestu již díky požadavku České inspekce životního prostředí na vyhnízdění rorýse obecného (do 10.8.2015 nesměly být zahájeny práce na střešním pláště a lešení nesmělo být postaveno přes poslední patro objektu 1017) a následně byl zjištěn ještě větší rozsah demoličních prací na střeše (lokálně až osmivrstvá skladba střešní krytiny s prolitím asfaltovým tmelem), je tento požadavek oprávněný.		
Přílohy: č.1 Žádost o změnu termínu č.2 Protokol o kontrole ČIŽP - 27.5.2015 č.3 Historie naměřených teplot ve Světlé nad Sázavou 7-9/2015 vydaná Českým hydrometeorologickým ústavem		
<u>2. Budky pro rorýse</u>		
Požadavek České inspekce životního prostředí stanovený v Protokolu o kontrole ČIŽP ze dne 27.5.2015 je umožnit vyhnízdění rorýse obecného v stávajících dutinách střešního pláště, tj. do 10.8.2015 nezačínat práce na demontáži stávajícího střešního pláště objektu 1017 a do stejného data nedostavovat lešení přes poslední patro objektu 1017. Dále pak na severní fasádu obou objektů umístit vždy po čtyřech trojbudkách pro řízené hnízdění rorýse v dalších obdobích.		
Důvodem tohoto požadavku je skutečnost, že se jedná o významnou lokalitu hnízdiště rorýse obecného a o objekty zvláště vhodné pro tento účel.		
Přílohy: č.2 Protokol o kontrole ČIŽP - 27.5.2015		
<u>3. Navýšení tloušťky demontovaného asfaltového střešního pláště</u>		

Při zahájení demontáže asfaltového střešního pláště objektu 1017 bylo zjištěno, že se nejedná o čtyřvrstvou skladbu jak je popsáno ve výkazu výměr, ale o skladbu osmivrstvou.

Změna spočívá v navýšení objemu prací v souvislosti s odstraněním střešního pláště. Při sestavení výkazu výměr se vycházelo z dostupných informací o historii objektu, o jeho opravách a modernizacích. Z důvodu havarijního stavu střešního pláště a obav z následného zatékání, nebyly provedeny sondy v přípravné fázi projektu.
Přílohy: č. 4 - Fotodokumentace

Změna nezbytná pro realizaci díla, bude plně hrazena z prostředků Kraje Vysočina.

4. Méněpráce – snížení množství demontovaných garnýží a odpočet lišt s kabelovým kanálem

Na základě požadavku zástupců uživatele nebyly demontovány stávající garnýže v plném rozsahu. Uživatel s výhodou v provozu využije kombinaci zastínění žaluziemi i závěsy a záclonami.

Na základě sdělení zástupců uživatele není v současnosti potřeba instalovat vkládací kabelové lišty, protože většina kabeláže předpokládaná do těchto lišt je v současném stavu objektu nefunkční a ve velké míře demontována. S její rekonstrukcí se v navrženém rozsahu neuvažuje.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
-144 473,00 Kč	88 098,42 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-56 374,58 Kč	<u>4.11.2015</u>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkov. a
žitkova 51, 587 03 Jihlava

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

STAVO INTERIER®
STAVOINTERIER s.r.o.
Kozl 201
580 01 Hovlíčkův Brod IČO 25943367
tel./fax: 569 420 256 DIČ CZ25943367

Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:



Žádost o změnu termínu

Věc : Žádost o prodloužení termínu na akci : Akademie VOŠ ,rekonstrukce budovy DM , Světlá nad Sázavou

Odůvodnění : Při rekonstrukci budov 1017 a 1018 nebylo možné pracovat na vnějším plášti fasády. A to z technologických důvodů, jelikož práce s lepidlem není možná od teplot 25 °C . Zastavení a zákaz těchto prací je v zápisu ve stavebním deníku. Za stavební dozor ing.Pokorný .

Vysoké teploty letošního léta nám neumožnily pracovat 19 dní v červenci , 19 dní v srpnu a 1 den v září . Celkem tedy 39 dní. Tyto údaje budou doloženy daty z Českého hydrometeorologického ústavu.

Závěr : Žádáme proto o prodloužení termín předání stavby o 35 dní.

Za Stavointerier :

Pavel Blažek



STAVO INTERIER s.r.o.
Kosí 201
580 01 Havlíčkův Brod IČO 25943367
tel./fax: 569 420 256 DIČ CZ25943367



KRAJ VYSOČINA		12
Došlo dne:	23 -09- 2015	Počet listů
Č.j.:	63904/2015	Počet stránek



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
Adresa: Bělohorská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: 569 496 111, fax: 569 496 177
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public_hb@hb.czp.cz, www.siep.cz
ID DS: : htkdzar

Protokol o kontrole řj. ČIŽP/46/OOP/1507214.003/15/HPK

Kontrola je prováděna na základě ustanovení § 80 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen zákon*), a procesně se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolním řád) (*dále jen zák. č. 255/2012 Sb.*), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Kontrolní orgán: Česká inspekce životního prostředí (*dále jen inspekce*)

Kontrolující:

RNDr. Petr Kostřica, inspektor oddělení ochrany přírody, služební průkaz č. 1464

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina, IČ 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava (*dále jen Kraj Vysočina*)

Fyzická osoba přítomná na místě kontroly za kontrolovanou osobu podle § 5 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb.: Ing. Jan Kallna, úředník odboru majetkového KrÚ Kraje Vysočina, zástupce ve věcech technických Kraje Vysočina pro kontrolovanou stavbu.

Další osoby přítomné kontrole (pokud jejich přítomnost připouští kontrolní orgán i kontrolovaná osoba):

Ing. Jindřich Vodička, ředitel Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, IČ 15060977 (*dále jen Akademie*)

Mgr. Zdeněk Loudát, zástupce ředitele Akademie pro praktické vyučování

Předmět kontroly:

Předmětem kontroly je upřesnění rozsahu stavebních prací prováděných a zamýšlených provádět v roce 2015 v areálu Akademie, jejíž některé objekty jsou hnízdištěm rorýsa obecného, sledovaným Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, krajské středisko Havlíčkův Brod (*dále jen AOPK*).

Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena: kontrola byla zahájena předložením pověření ke kontrole v podobě průkazu inspekce ve smyslu § 4 odst. 3 písm. b) zák. č. 255/2012 Sb.

Den provedení zahajovacího kontrolního úkonu: 27.5.2015

Čas provedení kontroly na místě: Dne 27.5.2015 od 14:00 h v areálu Akademie.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento úkon proveden: provedení kontroly na místě dne 27.5.2015

Kontrolní zjištění - popis zjištěných skutečností:

I. Skutečnosti zjištěné při inspekčním šetření na lokalitě dne 22.5.2015:

Při tomto šetření bylo zjištěno, že hlavní areál Akademie je tvořen panelovými objekty s plochou střechou, s následující aktuální charakteristikou:

1. Blok čp. 547: Dvoupatrová budova tč. bez provádění vnějších stavebních úprav, průduchy do atiky na severní straně vyústí na fasádě v podobě kruhových otvorů o průměru cca 3 cm, zpravidla krytých mřížkou.
2. Blok čp. 543: Čtyřpatrová budova tč. bez provádění vnějších stavebních úprav, podle sdělení Mgr. Loudáta byla u této budovy před několika lety provedena oprava střechy, v rámci níž patrně došlo při opravě fasády a oplechování obvodové podstřešní římsy budovy k zaslepení větracích průduchů do atiky.
3. Blok čp. 544: Čtyřpatrová budova tč. bez provádění vnějších stavebních úprav, jižní a severní strana budovy bez průduchů do atiky, na východní a západní straně budovy zdokumentováno po 9 větracích průduších do atiky o průměru 8-10 cm.
4. Blok čp. 545: Čtyřpatrová budova tč. ze všech čtyř stran obestavěná lešením, ze kterého bylo dokončováno zateplení fasády izolační vatou. Obvodová podstřešní římsa budovy nově omítnuta bez ponechání větracích průduchů do atiky budovy. Podle fotografií stažených ze stránek <https://www.google.cz/maps> byla před zahájením prací budova v podobném stavu jako blok čp. 544, tzn. s větracími průduchy na východní a západní straně budovy.
5. Blok bez čísla popisného na pozemcích p.č. dle KN st. 1021/1, 1021/2 a 1021/3 v k.ú. Světlá nad Sázavou. Jednopatrový celek představující spojovací koridor mezi budovami čp. 543, 544 a 545, tč. bez provádění vnějších stavebních úprav. Na severní straně koridoru zjištěno celkem 33 průduchů do atiky o průměru 8-10 cm.

Podle sdělení Mgr. Z. Loudáta jsou stavební práce na budově čp. 545 prováděny na základě rozhodnutí o stavebním povolení vydaném odborem stavebním MěÚ Světlá nad Sázavou, čj. MSNS/18879/2013/OSU-4 ze dne 11.12.2013. Objednatel a investorem akce je Kraj Vysočina, zastoupený ve věcech technických Ing. Zdeňkem Berkou z odboru majetkového KrÚ a zhotovitelem je společnost Stavointerier s.r.o., IČ 25943367, se sídlem Kozl 201, 580 01 Havlíčkův Brod. Práce na opravě střechy budovy začaly v březnu 2015, zateplování fasády pak koncem dubna 2015.

V letošním roce je dále plánováno provedení zateplení rovněž na budovách čp. 544 a 543, a to jako samostatná stavební akce, jejímž investorem je opět Kraj Vysočina zastupovaný ve věcech technických Ing. Janem Kalinou z odboru majetkového KrÚ.

Výše uvedené skutečnosti jsou předmětem samostatného záznamu inspekce o úkonech předcházejících kontrole, který byl dán zúčastněným k nahlédnutí v průběhu kontroly.

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole dne 27.5.2015

Stav objektů v areálu Akademie odpovídá výše uvedenému popisu ze dne 22.5.2015. Ze sdělení zástupce kontrolované osoby vyplynulo, že stavební práce zahrnující mj. zateplení fasády na budově čp. 543 a 544 by měly být zahájeny 3.6.2015, a to na základě rozhodnutí o stavebním povolení vydaném odborem stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Světlá nad Sázavou, čj.

MSNS/17363/2014/8-4 ze dne 24.10.2014 a čj. MSNS/17362/2014/8-4 ze dne 27.10.2014. Podle projektové dokumentace pro objekt čp. 544 dojde kromě zateplení fasády také krozebrání střechy a k její kompletní rekonstrukci. Tím zaniknou prostory, které v současnosti slouží jako hnízdiště rorýsa. Ke stejnému stavebnímu řešení došlo i při rekonstrukci střechy na objektu čp. 545. Tato rekonstrukce probíhala od listopadu 2014 do února 2015.

Kontrolní zjištění – závěr

Rorýs obecný patří mezi zvláště chráněné druhy podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona, a to v kategorii druhů ohrožených. Ochranné podmínky zvláště chráněných druhů živočichů jsou stanoveny v § 50 odst. 1 a odst. 2 zákona, podle něhož jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat.

Ochranu rorýsa v panelových domech na území města Světlá nad Sázavou pak konkrétně specifikuje obecně platná výjimka vydaná podle § 56 zákona formou veřejné vyhlášky OŽP KrÚ Kraje Vysočina čj. KUJI 18377/2013 OŽP 1763/2012/Vac/4 ze dne 14.3.2013.

Vzhledem k tomu, že podle sdělení AOPK se v objektech čp. 544 a 545 a v objektu spojovacího koridoru nacházejí hnízdiště rorýsa obecného a jeho ochranné podmínky stanovené zákonem by mohly být při provedení zateplení objektu čp. 545 a realizací záměru zateplení objektu čp. 544 porušeny, **upozorňuje inspekce na nutnost dodržení podmínek výše uvedené výjimky vydané OŽP KrÚ Kraje Vysočina, což konkrétně předpokládá:**

- Vytvoření náhradního hnízdiště pro rorýsa jako náhrady za původní hnízdiště v atice budovy čp. 545, a to v podobě 4 trojmístných budek pro rorýsa, které budou umístěny do fasády v horní části severní stěny budovy čp. 543, a to do konce roku 2015. (Umístění budek na budovu čp. 545 již nelze provést vzhledem u dokončené opravě fasády)
- V době hnízdění rorýsů (do 10.8.2015) nebudou prováděny práce na rekonstrukci střechy budovy čp. 544 a lešení na západní a východní straně budovy čp. 544 bude v tuto dobu postaveno pouze do úrovně horního madla ochranného zábradlí balkonů a lodžii nejvyššího tj. 4. patra budovy. V horní části severní stěny budovy čp. 544 budou umístěny 4 třímístné budky pro rorýsa, a to v termínu do konce roku 2015 jako náhrada za původní hnízdiště v atice budova čp. 544.

Pokud by stavební práce na záměru zateplení a opravy střechy objektu spojovacího koridoru vyžadovaly stavební řešení zasahující do ochranných podmínek rorýsa, bude nutno požádat u KrÚ Kraje Vysočina o povolení samostatné výjimky podle § 56 zákona konkrétně pro tuto stavbu.

Vzhledem k dosavadnímu průběhu stavebních prací inspekce konstatuje, že ke dni 27.5.2015 nedošlo ze strany kontrolované osoby k porušení žádného ustanovení zákona.

Byla pořízena fotodokumentace: ano dne 22.5.2015 - v počtu 27 snímků zachycujících stavební objekty na výše uvedené lokalitě s ohledem na stav podstřešních prostor.

Byly odebrány vzorky: nebyly

Podklady, ze kterých kontrolní zjištění vycházejí:

- záznam o úkonech předcházejících kontrole ze dne 22.5.2015 včetně fotodokumentace
- ortofotomapa lokality, výpisy listů vlastnictví k objektům v areálu Akademie
- fotografie lokality získané z <https://www.google.cz/maps>
- výše citovaná stavební povolení vydaná odborem stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Světlá nad Sázavou,

Vyjádření zástupce kontrolované osoby přítomné kontrole stvrzené podpisem:

Ing. Kalina Jan: Souhlasím a žádám o okamžité poskytnutí informace o ukončení hnízdění rorýsa obecného na území města Světlá nad Sázavou v letošním roce.

Vyjádření dalších osob přítomných kontrole:

Ing. J. Vodička: Nepřítomen v době ukončení protokolu


Mgr. Z. Loudát: Protokol odpovídá skutečnosti

Kontrolovaná osoba má podle ust. § 13 zákona č. 255/2012 Sb. právo podat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, a to podáním učiněným u České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod. Námitky se podávají písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Z námitek musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Datum vyhotovení protokolu: 27.5.2015

Podpis kontrolujícího pracovníka inspekce :

RNDr. Petr Kostřica



Tento protokol byl vyhotoven v počtu 2 stejnopisů a obsahuje 4 strany.

Stejnopis č. 1 – si ponechá inspekce, stejnopis č. 2 – bude zaslán kontrolované osobě do datové schránky.



ČESKÝ
HYDROMETEOROLOGICKÝ
ÚSTAV

POBOČKA PRAHA

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE: 16.9.2015
NAŠE ZNAČKA: 150722
VYŘÍZUJE: Ing. Václav Pokorný
DATUM: 22.9.2015
TELEFON: 244 032 502
E-MAIL: vaclav.pokorny@chmi.cz

STAVOINTERIER s.r.o.
Kozí 201
580 01 Havlíčkův Brod

Věc: Teplota; Světlá n/S; 1.7.-21.9.2015

Přílohy: faktura

Na základě Vaší objednávky Vám pro lokalitu Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, zasíláme výpis hodnot teploty vzduchu v časech 11, 15 a 17 h SELČ za období 1.7. - 21.9.2015 podle měření naší nejbližší stanice Havlíčkův Brod.

Za vyřízení objednávky Vám podle Ceníku služeb, informací a výkonů, které poskytuje ČHMÚ, položky 9883 účtujeme 3000 Kč. Faktura již uhrazena.

S pozdravem


Mgr. Ilona Zusková
vedoucí OMK pobočky Praha

ČHMÚ - stanice Havlíčkův Brod: teplota vzduchu v 11, 15 a 17 h
SELČ za období 1.7. - 21.9.2015 (°C)

Měsíc	Den	T 11 h	T 15 h	T 17 h
07	1	25,4	27,6	28,0
07	2	26,7	29,0	29,3
07	3	27,5	30,4	31,3
07	4	29,3	32,2	32,4
07	5	31,3	34,9	34,1
07	6	28,5	29,0	29,3
07	7	29,1	34,0	34,2
07	8	21,1	19,5	19,3
07	9	19,6	12,8	15,5
07	10	16,4	20,3	20,3
07	11	18,8	22,9	23,7
07	12	25,8	28,8	28,0
07	13	19,5	19,8	20,1
07	14	19,1	20,6	19,8
07	15	19,0	21,3	22,4
07	16	27,5	29,8	30,3
07	17	29,3	33,9	24,9
07	18	30,1	28,0	27,2
07	19	26,7	30,8	32,9
07	20	23,2	26,7	27,3
07	21	28,6	32,6	33,4
07	22	30,9	34,9	36,0
07	23	22,2	25,2	26,3
07	24	25,8	30,8	30,3
07	25	27,1	28,0	24,0
07	26	18,6	22,2	22,9
07	27	20,8	16,2	22,1
07	28	20,3	23,2	23,2
07	29	19,6	21,1	21,1
07	30	17,8	20,8	20,9
07	31	19,3	22,7	22,4
08	1	22,6	25,2	25,5
08	2	22,5	20,4	19,1
08	3	25,4	27,6	27,8
08	4	28,1	31,4	31,4
08	5	25,2	29,7	30,1
08	6	30,4	34,2	33,9
08	7	32,9	34,5	34,9
08	8	31,7	34,9	34,7
08	9	29,0	34,2	32,4
08	10	31,9	34,4	33,9
08	11	32,6	32,4	29,9
08	12	31,8	31,1	29,8

Měsíc	Den	T 11 h	T 15 h	T 17 h
08	13	30,9	32,1	33,2
08	14	30,4	34,5	34,0
08	15	27,6	18,8	26,7
08	16	25,7	27,2	26,7
08	17	18,0	20,1	18,8
08	18	14,2	14,4	14,9
08	19	16,0	18,3	18,0
08	20	19,5	22,4	21,4
08	21	21,4	22,6	23,9
08	22	20,6	20,6	20,8
08	23	19,3	21,7	21,6
08	24	19,1	23,4	25,0
08	25	16,8	17,0	19,9
08	26	21,9	25,2	25,0
08	27	24,0	28,6	27,6
08	28	26,7	27,8	29,0
08	29	26,0	29,8	30,3
08	30	28,3	31,6	31,6
08	31	28,0	31,8	31,1
09	1	29,4	34,9	31,4
09	2	16,5	20,4	18,8
09	3	18,0	20,3	19,6
09	4	18,8	20,1	20,1
09	5	16,8	18,8	18,5
09	6	10,8	12,3	12,5
09	7	12,9	11,0	11,5
09	8	12,9	16,5	15,9
09	9	13,6	9,7	12,1
09	10	13,9	13,6	16,0
09	11	15,5	16,7	16,4
09	12	14,9	20,4	19,5
09	13	19,4	22,1	21,3
09	14	20,1	19,3	19,2
09	15	18,0	19,1	18,5
09	16	19,1	22,9	22,9
09	17	24,4	29,0	27,5
09	18	12,4	13,3	13,9
09	19	16,8	21,5	20,0
09	20	13,4	12,9	14,6
09	21	13,4	16,7	15,9

PRÍLOHA č. 4

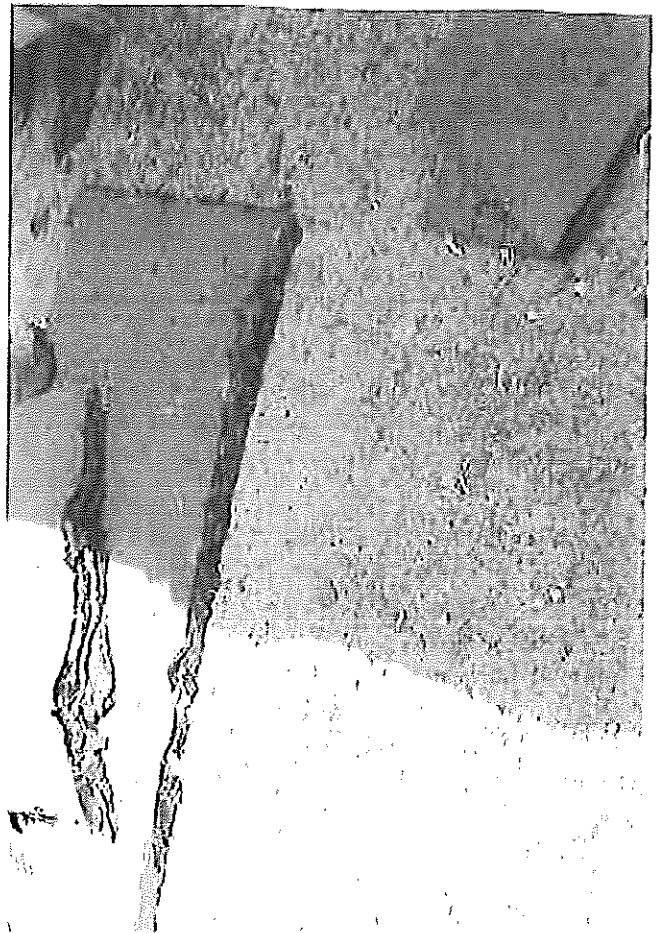

Krycí list rozpočtu			
Číslo zakázky 141204		Zakázka Internát - Světlá nad Sázavou - VOŠ, gymn. a SOŠ	
Komentář			
Popis verze		Dodatek č.1	
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2014	Datum dokončení	
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Objednatel	Kraj Vysočina	Pavel Blažek	564 602 111, 564 602 100
Zhotovitel	Stavointerier s.r.o.		569 420 256
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Petr Nimmertondl		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařazení	Zařídění
1	Objekt 1017		
1	Přípravné práce, zemní práce a základy		
2	Objekt 1018		
2	Konstrukce		
		Celkem (bez DPH)	-56 374,58 Kč
		DPH	-11 838,66 Kč
		DPH 21 % ze základny: -56 375	-11 838,66 Kč
		Celkem (včetně DPH)	-68 213,24 Kč
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Pavel Blažek	Jméno :	0
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Poznámka :			
			
STAVOINTERIER s.r.o. ③ Kozl 201 580 01 Havlíčkův Brod IČO 25943367 tel./fax: 569 420 256 DIČ CZ25943367			

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žitkova 57, 587 33 Jihlava



PP RENTAX, s.r.o.
Husovo náměstí 63
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ 15059049
DIČ CZ15059049

projekt s.r.o.
Kubeček 224/48
130 00 Praha 3
OIČ: 022751721
Tel. / Fax: +420 598 431 003

Zakázka:

Internát - Světlá nad Sázavou - VOŠ, gymn. a SOŠ

Popis	Cena	Cena s DPH	Počet položek
O: Odpočtové položky	- 144 473,00	- 30 339,33	5
D_05: Demontáž vícevrstvé stávající střešní krytiny obj. 1017	- 6 880,88	- 1 444,98	1
1: Objekt 1017	- 6 880,88	- 1 444,98	1
712: Povlakové krytiny	- 6 880,88	- 1 444,98	1
D_06: Odpočet demontovaných garnyží	- 4 918,92	- 1 032,97	2
1: Objekt 1017	- 2 459,46	- 516,49	1
009: Ostatní konstrukce a práce - bourání	- 2 459,46	- 516,49	1
2: Objekt 1018	- 2 459,46	- 516,49	1
009: Ostatní konstrukce a práce - bourání	- 2 459,46	- 516,49	1
D_07: Odpočet lišt podlahových	- 132 673,20	- 27 861,37	2
1: Objekt 1017	- 66 336,60	- 13 930,69	1
776: Podlahy povlakové	- 66 336,60	- 13 930,69	1
2: Objekt 1018	- 66 336,60	- 13 930,69	1
776: Podlahy povlakové	- 66 336,60	- 13 930,69	1
P: Přípočtové položky	88 098,42	18 500,67	13
D_02: Budky pro rořýse	33 258,11	6 984,20	6
1: Objekt 1017	16 629,05	3 492,10	3
766: Konstrukce truhlářské	16 629,05	3 492,10	3
2: Objekt 1018	16 629,05	3 492,10	3
766: Konstrukce truhlářské	16 629,05	3 492,10	3
D_05: Demontáž vícevrstvé stávající střešní krytiny obj. 1017	54 840,31	11 516,47	7
1: Objekt 1017	54 840,31	11 516,47	7
099: Přesun hmot	40 393,38	8 482,61	4
712: Povlakové krytiny	14 446,93	3 033,86	3
Celkem (bez DPH)	- 56 374,58		
DPH	- 11 838,66		
DPH 21 % ze základny: -56 375	- 11 838,66		
Celkem (včetně DPH)	- 68 213,24		

Zakázka:

Internát - Světlá nad Sázavou - VOŠ, gymn. a SOŠ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
O: Odpočtové položky							
D_05: Demontáž vícevrstvé stávající střešní krytiny obj. 1017							- 144 473,00
1: Objekt 1017							- 6 880,88
712: Povlakové krytiny							- 6 880,88
146.	SP	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	586,938	11,72	- 6 880,88
v.č. 8-51-vodorovně-střešní krytina-2x2 asfaltové lepenky (nad izolací a							- 6 880,88
od izolací) 1135*15,4-3,6*5,951*1,1+16*1,1)*2							- 6 880,88
-1*((135*15,4-3,6*5,951)*1,1+16*1,1)							- 6 880,88
							- 586,938

D_06: Odpočet demontovaných garnyží

1: Objekt 1017

- 4 918,92

009: Ostatní konstrukce a práce - bourání

- 2 459,46

124.	SP	21	Demontáž garnyží a záclon včetně likvidace-všechna okna mimo	soubor	- 0,351	7 000,00	- 2 459,46
sociálních zařízení, včetně odvozu a - likvidace na skládce							- 2 459,46
celkem v objektu 74 ks							-
demontovaných 48 ks							-
-1/74*26							- 0,351

2: Objekt 1018

- 2 459,46

009: Ostatní konstrukce a práce - bourání

- 2 459,46

73.	SP	18	Demontáž garnyží a záclon včetně likvidace-všechna okna mimo	soubor	- 0,351	7 000,00	- 2 459,46
sociálních zařízení, včetně odvozu a - likvidace na skládce							- 2 459,46
celkem v objektu 74 ks							-
demontovaných 48 ks							-
-1/74*26							- 0,351

D_07: Odpočet lišt podlahových

1: Objekt 1017

- 132 673,20

776: Podlahy povlakové

- 66 336,60

287.	SUB	97	lišta pro vinilovou podlahovinu či PVC podlahu	m	- 232,76	285,00	- 66 336,60
------	-----	----	--	---	----------	--------	-------------

2: Objekt 1018

- 66 336,60

776: Podlahy povlakové

- 66 336,60

266.	SUB	89	lišta - umělohmotná lišta s velkým kabelovým kanálem (kabel je	m	- 232,76	285,00	- 66 336,60
vyměnitelný bez demontáže lišty) se - skládá z elastického, rázově							- 66 336,60
houževnatého plastu (PVC) a je opatřena pružnými chlopněmi pro /							-
vyrovnání nerovností podlahy a stěn. Výška 5 cm, šířka 2,5 cm, k							-
podkladu lepit lepidlem vhodným pro							-

P: Přípočtové položky

D_02: Budky pro rorýse

88 098,42

1: Objekt 1017

33 258,11

766: Konstrukce truhlářské

16 629,05

314.	SP	X23	Montáž budky do zateplení dle nového detailu - Budka pro rorýse -	kus	4,0	550,00	2 200,00
včetně kotveního materiálu							-
315.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do	%	1,1	164,48	180,93
24 m							-
320.	H	X24	Budka pro rorýse viz. PD - Vnější rozměr budky: 150x150x980mm	kus	4,0	3 562,03	14 248,12
Vnitřní rozměr budky: 140x140x300mm - rozměr jedné dutiny							-

2: Objekt 1018

16 629,05

766: Konstrukce truhlářské

16 629,05

314.	SP	X23	Montáž budky do zateplení dle nového detailu - Budka pro rorýse -	kus	4,0	550,00	2 200,00
včetně kotveního materiálu							-
315.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do	%	1,1	164,48	180,93
24 m							-

Poi.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
321.	H	X24	Budka pro rořýse viz. PD - Vnější rozměr budky: 150x150x980mm Vnitřní rozměr budky: 140x140x300mm - rozměr jedné dutiny	kus	4,0	3 562,03	14 248,12

D_05: Demontáž vícevrstvé stávající střešní krytiny obj. 1017
1: Objekt 1017

54 840,31

059: Přesun hmot

54 840,31

127.	SP	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	35,216	152,32	5 364,23
130.	SP	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískladku do 1 km se složením	t	35,216	157,92	5 561,29
131.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	739,542	6,85	5 062,98
137.	SUB	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovně)	t	35,216	693,00	24 404,88

712: Povlakové krytiny

341.	SP	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé (35*15,4-3,6*5,95)*1,1+16*1,1	m2	586,938	12,85	7 542,50
------	----	-----------	---	----	---------	-------	----------

342.	SP	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvou ([(35*15,4-3,6*5,95)*1,1+16*1,1]*5	m2	2 934,69	1,35	3 969,74
------	----	-----------	--	----	----------	------	----------

343.	SP	X33	Příplatek za odstranění asfaltové zálivky mezi hydroizolacemi celková tl. hydroizolace střechy 8cm = cca 80kg/m2 rozdíl váhy od demontovaných vrstev 80-54=26kg	m2	586,938	5,00	2 934,69
------	----	-----	---	----	---------	------	----------

