

STAVBA:





II/348 Chyška - most ev.č. 348-006

OBJEDNATEL:



Kraj Vysočina

Žižkova 57
587 33 Jihlava

 dipont DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724			Zakázka: D16001	Datum: 01/2017
ODP. PROJEKTANT SO	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	PDPS
ING. MARTIN PLŠEK	ING. JIŘINA MARŠALOVÁ	ING. PETR NOVÁK	Měřítko:	--
			Formát:	A4
STAVBA:			Část:	Paré:
II/348 Chyška - most ev.č. 348-006			A.3	
PŘÍLOHA:			Příloha:	
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY				

1	Charakteristika a celkové uspořádání staveniště.....	2
2	Stanovení obvodu staveniště	2
3	Zásady návrhu zařízení staveniště	2
4	Návrh postupu a provádění výstavby	2
5	Předčasné užívání	3
6	Napojení na zdroje energie	3
7	Přístupy na staveniště	3
8	Zabezpečení ochrany staveniště	3
9	Návrh řešení dopravy během výstavby	3
10	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.....	3
11	Harmonogram výstavby	4

1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště

Stavba mostu se nachází v extravilánu obce Chýška a převádí silnici č. II/348 přes trvalou vodoteč.

Stavba se nenachází v žádném chráněném území, nedojde k dotčení chráněných ložiskových území. Stavba se nenachází na poddolovaném území a nevyžaduje vyhlášení dalšího ochranného pásma.

2 Stanovení obvodu staveniště

Staveniště (stavba) se nachází v katastrálním území Chýška. Pro provedení stavby jsou nutné trvalé a dočasné zábory pozemků. Seznam dotčených pozemků, výměry a situace záborů jsou součástí přílohy *B.3 Záborový elaborát* vypracované v rámci předchozího stupně DSP.

Obvod staveniště je dán prostorovým uspořádáním stavebních objektů. Dočasný zábor pozemků je uvažován do vzdálenosti 2,0 m.

3 Zásady návrhu zařízení staveniště

Rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné uzavírky, umístění zařízení staveniště se předpokládá na komunikaci II/348.

Na staveništi budou využívána strojová zařízení bez nároků na energie. Staveniště bude vybaveno skladem, prostorem pro dodavatele, WC, zásobníkem vody na mytí a přenosnou diesellovou centrálou na výrobu elektrické energie.

4 Návrh postupu a provádění výstavby

Stavba bude realizována ve čtyřech základních etapách výstavby za úplné uzavírky komunikace na mostě.

1. etapa: příprava staveniště, dopravně inženýrská opatření
2. etapa: odfrézování vozovky, demolice mostu, výkopové práce
3. etapa: betonáž základů a nosné konstrukce mostu, práce na SO 101 po pláň komunikace
4. etapa: zhotovení nové vozovky, osazení zábradlí a svodidel, dokončovací práce, rekultivace

Před započítím prací musí být doprava svedena na objízdnu trasu

Zahájení stavebních prací se předpokládá v průběhu roku 2018. Před zahájením stavby je třeba požádat o zvláštní užívání komunikace.

5 Předčasné užívání

Etapizace stavby se nepředpokládá. Úprava komunikace II/348 a mostní objekt budou předány objednateli jako celek po dokončení stavebních prací.

Přehled budoucích vlastníků a správců:

SO 101	Komunikace	Kraj Vysočina (KSÚS Vysočiny)
SO 201	Most ev. č. 348 - 006	Kraj Vysočina (KSÚS Vysočiny)

6 Napojení na zdroje energie

Nepředpokládá se napojení na stávající inženýrské sítě. Na staveništi budou využívána strojová zařízení bez nároků na energie. Staveniště bude vybaveno WC, zásobníkem vody na mytí a přenosnou diesellovou centrálou na výrobu elektrické energie.

7 Přístupy na staveniště

Jako přepravní a přístupové trasy slouží komunikace stávajícího dopravního systému, který je v předmětné oblasti dostatečně hustý.

8 Zabezpečení ochrany staveniště

Zabezpečení ochrany staveniště je povinností zhotovitele stavby.

9 Návrh řešení dopravy během výstavby


Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice II/348. Silniční doprava bude svedena na objízdne trasy, které budou vyznačeny před započatím prací.

Problematika je podrobně řešena v příloze *B.2 Dopravně inženýrská opatření*.

10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Problematiku řeší samostatná příloha *E.3 Plán BOZP*, která je součástí předchozího stupně DSP.

11 Harmonogram výstavby

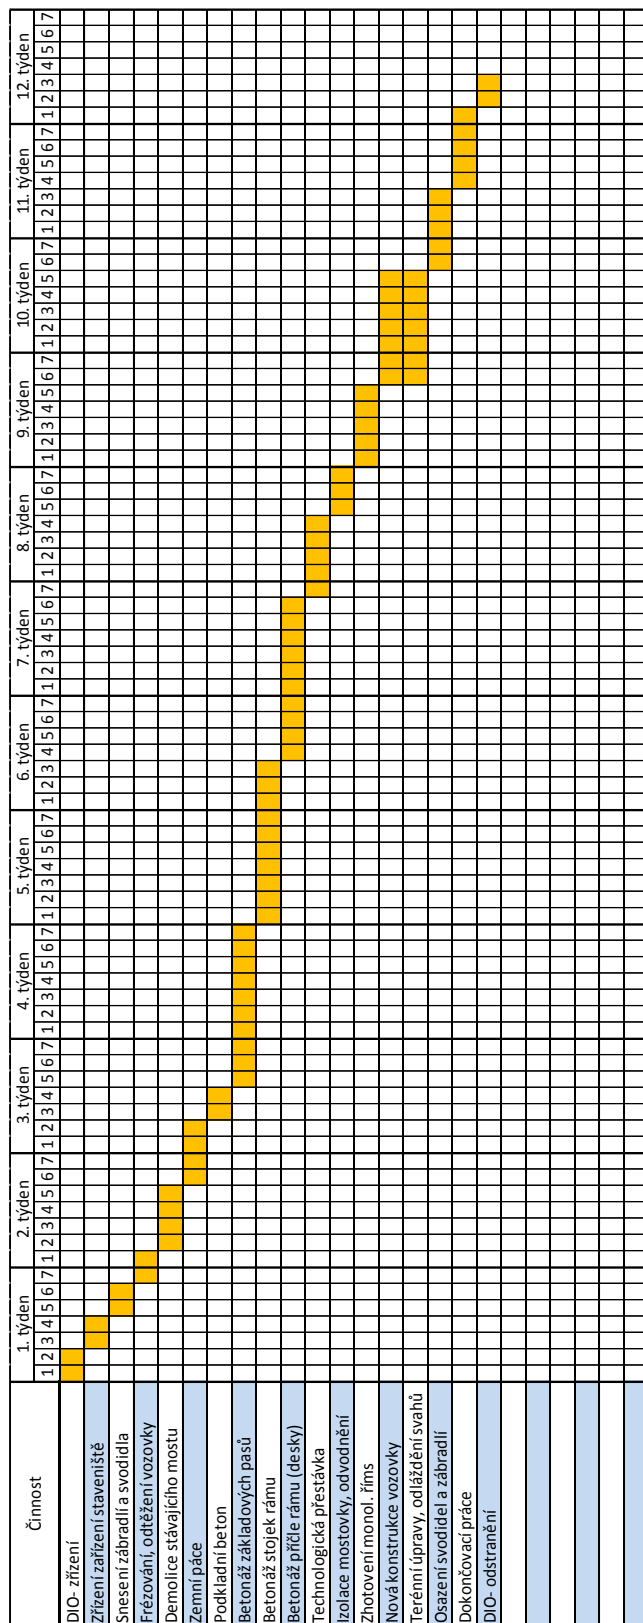

V Ústí nad Labem, leden 2017

Ing. Jiřina Maršalová

Průvodní zpráva k provánění stavby

STRANA 4/4

DIPONT s.r.o. | Ústí nad Labem | Datum: 10/2016

www.dipont.cz
