

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00109  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004150  
Registr smluv: ANO

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. VPI/MJ/2023/00109**

---

mezi

**CETIN a.s.**

a

**Kraj Vysočina**

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00109  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004150  
Registr smluv: ANO

**CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená Ing. Jiřím Tomáškem, manažerem, Výstavba a údržba fixní sítě Morava jih na  
základě pověření ev.č. PŘ/3891/2023

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

datová schránka: qa7425t

(dále jen „**CETIN**“)

a

**Kraj Vysočina**

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

zastoupený:

ve věcech smluvních: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Stanislav Juránek

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 123-6403810267/0100

IČO: 70890749

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(dále jen „**Smlouva**“)

**DEFINICE**

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

**CTN** je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

**Překládka** je stavba v k.ú. Obrataň spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

**Projekt** je realizační projektová dokumentace Překládky;

**Příprava Překládky** jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00109  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004150  
Registr smluv: ANO

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

**Vyjádření o existenci SEK** je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 24. 10. 2022 vydané pod čj. 794828/22, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC III\_1292 PE Obrataň, ul. Nádražní**“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
  - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
  - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00109  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004150  
Registr smluv: ANO

- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

#### 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

##### 4.1 Společnost CETIN se zavazuje

###### (a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

###### (b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

##### 4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však sedm (7) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

##### 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do devíti (9) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00109  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004150  
Registr smluv: ANO

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **211.568,- Kč** (slovy: dvě stě jedenáct tisíc pět set šedesát osm korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do šesti (6) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00109  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004150  
Registr smluv: ANO

se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech překládky stanovených po vyhotovení Projektu dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy. Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit na základě dodatku k této smlouvě, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít před provedením prací nebo vznikem nákladů souvisejících s překládkou SEK a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jeho uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku v uvedené lhůtě nedojde, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

- 5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00109  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004150  
Registr smluv: ANO

uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **29.691,- Kč** (slovy: dvacet devět tisíc šest set devadesát jedna korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

## 7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

### 8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová  
funkce: senior specialista výstavby sítě - smlouvy  
e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz ,tel.: 238 462 454

ve věcech technických: Petr Macho, DiS.  
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: petr.macho@cetin.cz, tel.: +420 720 758 105

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00109  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004150  
Registr smluv: ANO

## 8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtmán  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

ve věcech technických: Tomáš Pípal, úředník ODSH KrÚ Kraje Vysočina  
e-mail: [pipal.t@kr-vysocina.cz](mailto:pipal.t@kr-vysocina.cz), tel.: 564 602 386, 724 650 186

## 9. Odstoupení od Smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

## 10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.



Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00109  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004150  
Registr smluv: ANO

- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

## 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00109  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004150  
Registr smluv: ANO

(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu [contract\\_termination@cetin.cz](mailto:contract_termination@cetin.cz).

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00109  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004150  
Registr smluv: ANO

- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00109  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004150  
Registr smluv: ANO

CETIN:

V Brně

Stavebník:

V Jihlavě

---

**CETIN a.s.**  
Ing. Jiří Tomášek  
Manažer, Výstavba a údržba fixní sítě  
Morava jih

---

**Kraj Vysočina**  
Ing. Miroslav Houška  
náměstek hejtmana

## **Technická zpráva**

**Název:** VPIC III\_1292 PE Obrataň, ul. Nádražní

Stručný popis:

Akce řeší provizorní a definitivní přeložku metalických kabelů z důvodu rekonstrukce mostu a přilehlé komunikace v ul. Nádražní v obci Obrataň.

Navrhované řešení provizorní přeložka – Z důvodu rekonstrukce mostu je třeba dočasně přeložit metalické kabely vedle provizorní lávky. Na obou stranách mostu bude odkopána stávající trasa kabelů CETIN. Na obou koncích provizorního chodníku bude provedena montáž nových sloupů. Nad korytem řeky bude zavěšen nový kabel TCEKFLES 10xn0,4, který bude napojen na stávající kabely TCEPKPFLE 35xn0,4 a TCEPKPFLE 5xn0,4. Provede se montáž nových dělicích spojek a dojde k redukci stávajících kabelů. Přívody na kabelu TCEPKPFLE 35xn0,4 do stávajících rozvaděčů OBRT30; OBRT28; OBRT21 budou dočasně ochuzeny na 5 párů do každé skříně. Přednostně se zachovají páry, na kterých jsou služby. Zbylé zachované páry budou sloužit jako rezerva. Na kabelu TCEPKPFLE 5xn0,4 bude přednostně propojeny pár, na kterém je stávající služba do KR OBRT133. Dále se propojí 4 páry, které budou sloužit jako rezerva. Zbylé páry nebudou propojeny. Po dokončení definitivní překládky bude vše vráceno do původního stavu. Na akci je nutná PEW


Navrhované řešení definitivní přeložka – Při rekonstrukci mostu založí stavba do nové římsy PE chráničky pr.110mm, do které budou zataženy nové kabely TCEPKPFLE 35xn0,4 a TCEPKPFLE 5xn0,4. Provede se montáž nových spojek a vše bude vráceno do původního stavu. Provizorní trasa bude zrušena. Na akci je nutná PEW.

ÚR – zajistí stavebník  
PD -Ano  
Geo –Ano  
GP-Ano  
VBR –Ano

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601  
Tomáš Pípal  
tel.: 605 660 386 e-mail: [pipal.t@kr-vysocina.cz](mailto:pipal.t@kr-vysocina.cz)


Projektant: DIK, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
Ing. Jiří Eliášek  
mob: 733 130 112 e-mail: [eliasek@dik-hk.cz](mailto:eliasek@dik-hk.cz)

# Provizorní přeložka

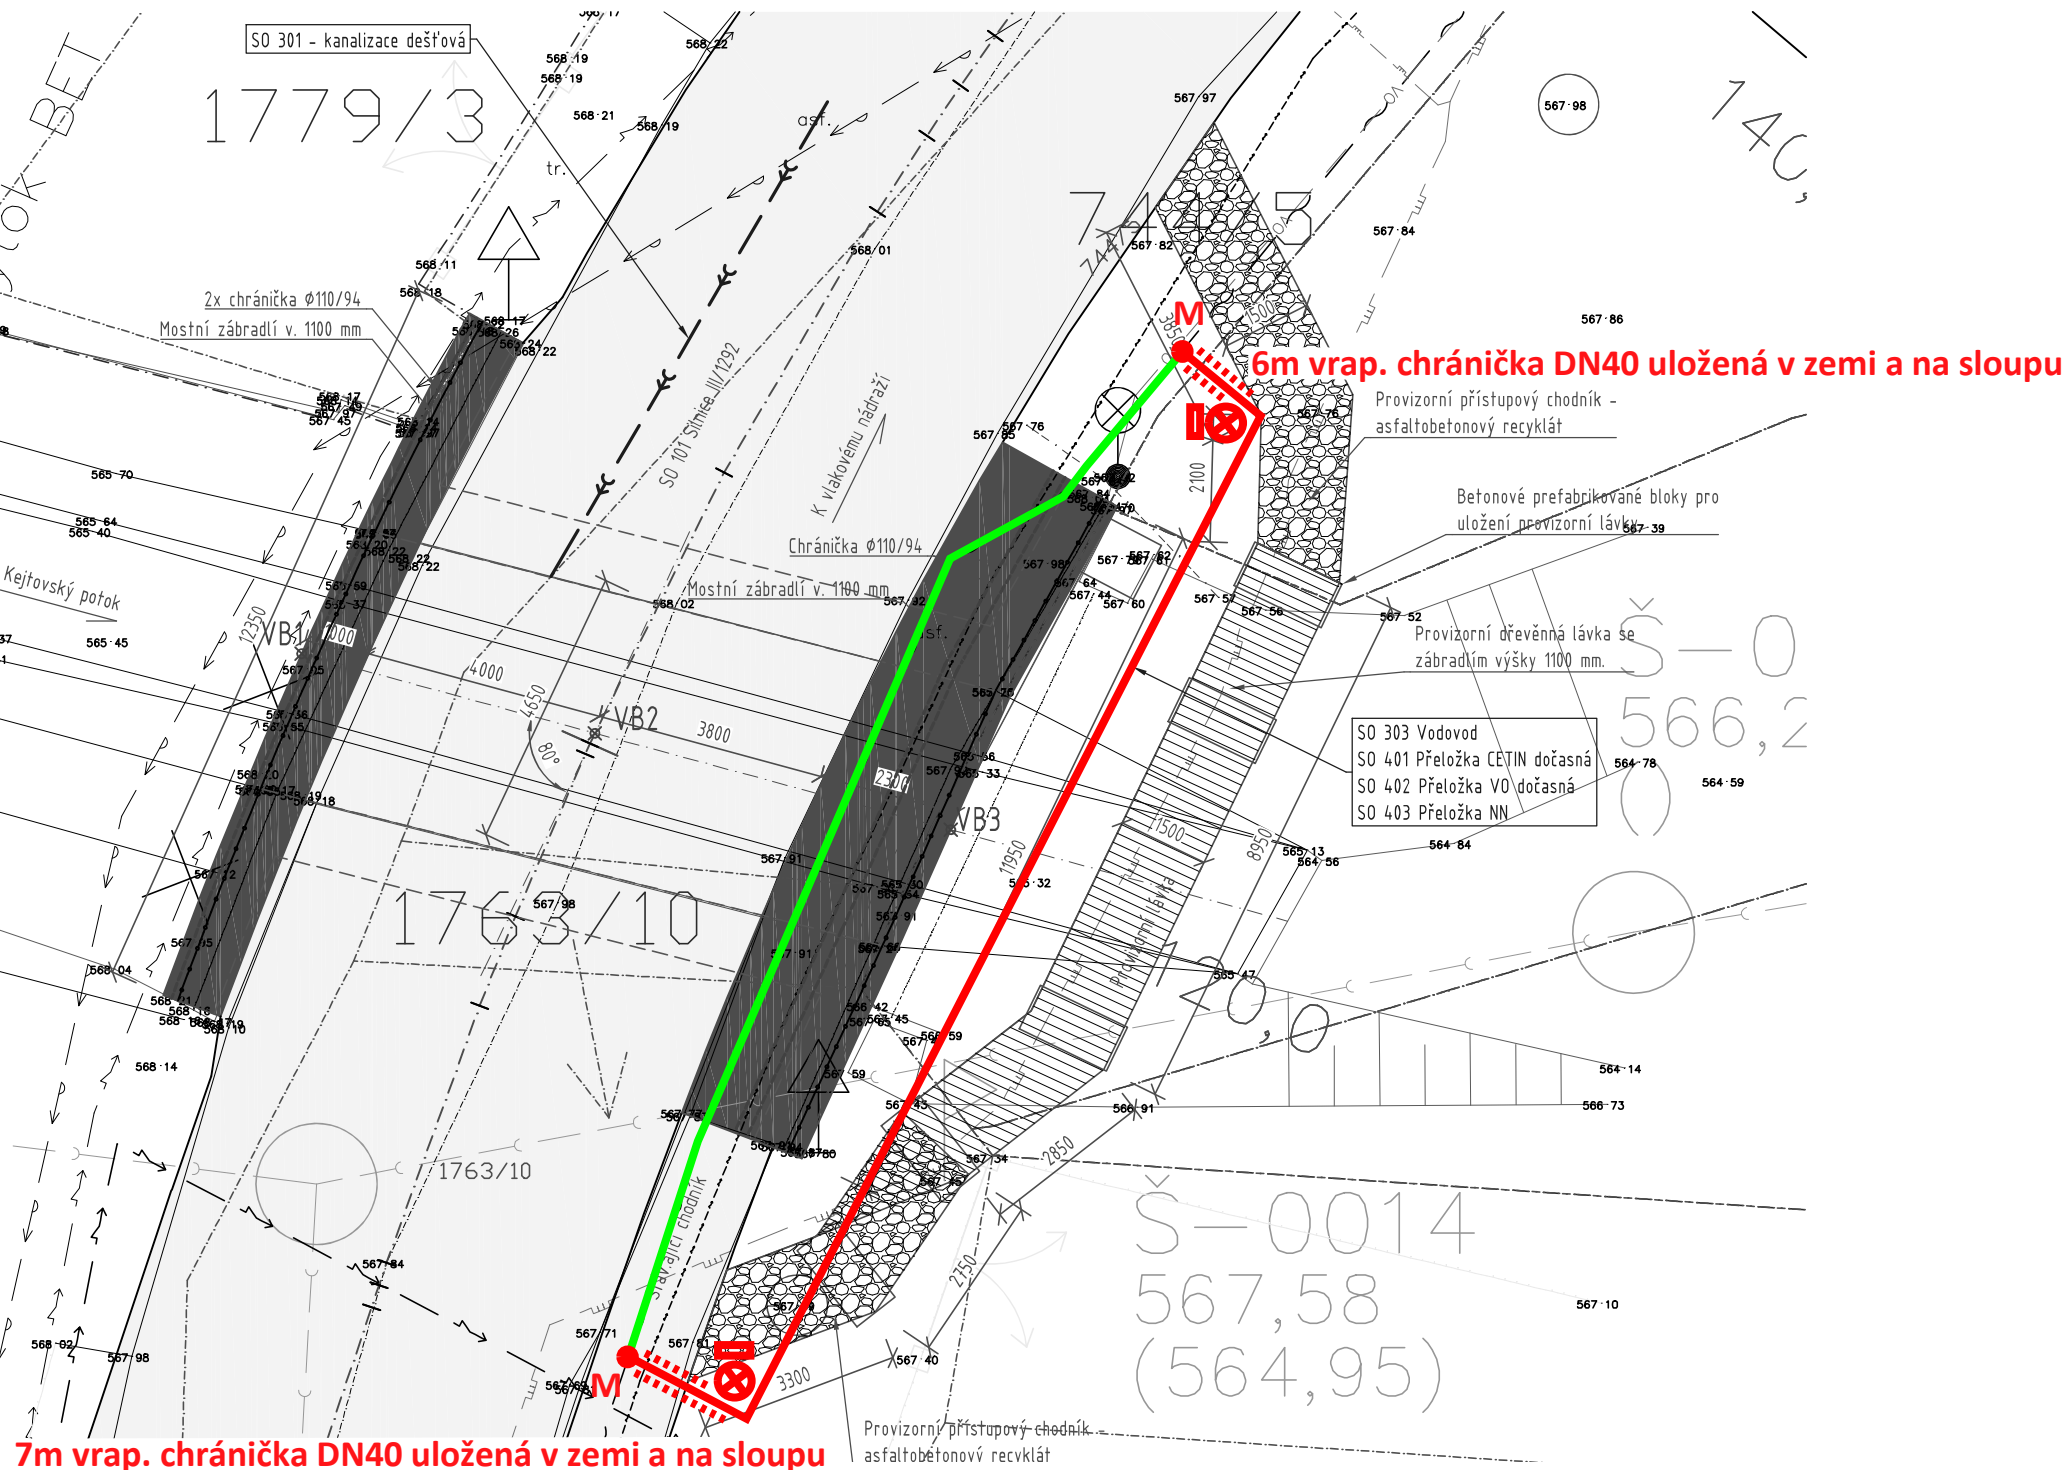




## Definitivní přeložka

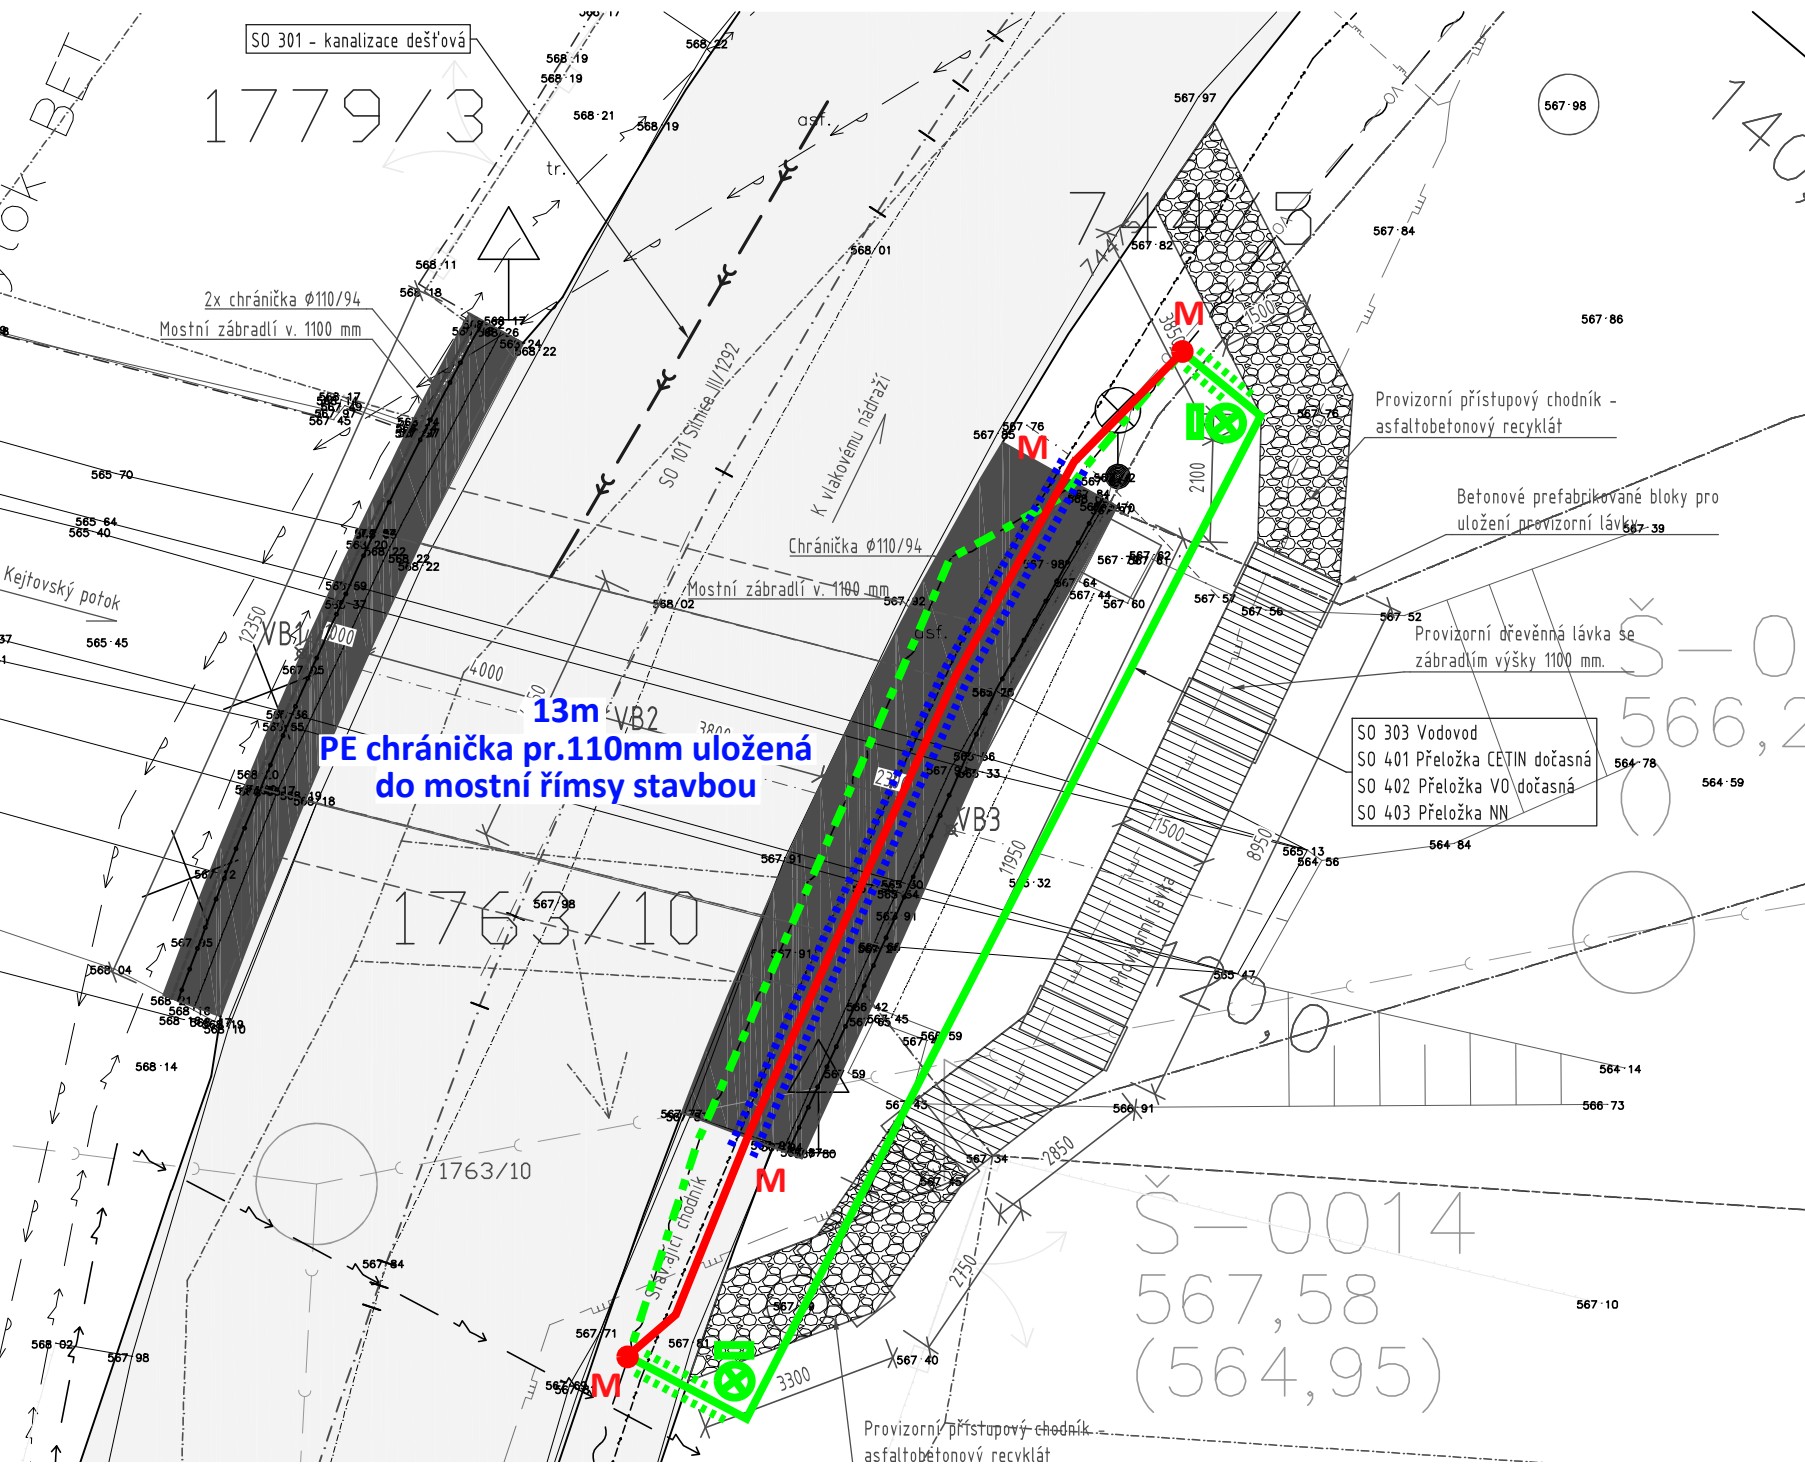

## Informace o pozemku

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Parcelní číslo:           | <a href="#">744/5</a>                   |
| Obec:                     | <a href="#">Obrataň [548472]</a>        |
| Katastrální území:        | <a href="#">Obrataň [708712]</a>        |
| Číslo LV:                 | <a href="#">10001</a>                   |
| Výměra [m <sup>2</sup> ]: | 267                                     |
| Typ parcely:              | Parcela katastru nemovitostí            |
| Mapový list:              | <a href="#">GUST2880.V.S.VIII-25-12</a> |
| Určení výměry:            | Graficky nebo v digitalizované mapě     |
| Způsob využití:           | jiná plocha                             |
| Druh pozemku:             | ostatní plocha                          |

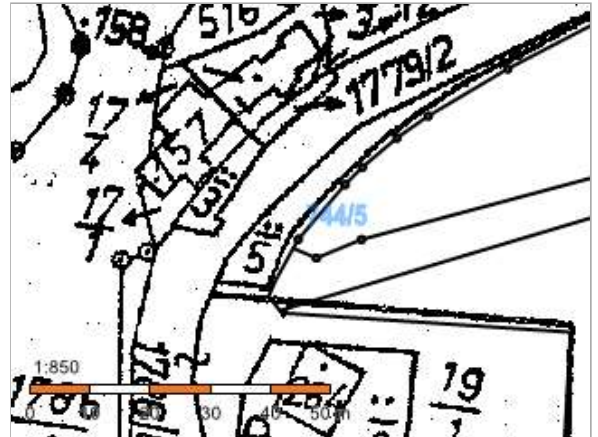

## Vlastníci, jiní oprávnění

### Vlastnické právo

Podíl

Obec Obrataň, č. p. 204, 39412 Obrataň

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

### Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📍 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Pelhřimov](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.11.2022 14:00.



## Informace o pozemku

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Parcelní číslo:           | <a href="#">1763/10</a>                     |
| Obec:                     | <a href="#">Obrataň [548472]</a>            |
| Katastrální území:        | <a href="#">Obrataň [708712]</a>            |
| Číslo LV:                 | <a href="#">342</a>                         |
| Výměra [m <sup>2</sup> ]: | 27  |
| Typ parcely:              | Parcela katastru nemovitostí                |
| Mapový list:              | <a href="#">GUST2880,V.S.VIII-25-15</a>     |
| Určení výměry:            | Graficky nebo v digitalizované mapě         |
| Způsob využití:           | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |
| Druh pozemku:             | vodní plocha                                |

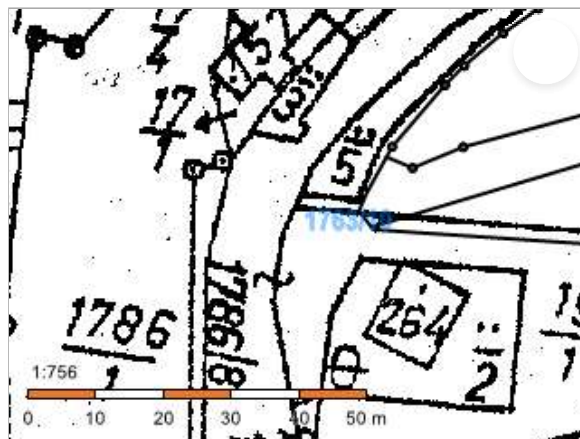

## Vlastníci, jiní oprávnění

|  |       |
|--|-------|
| Vlastnické právo   | Podíl |
| Česká republika  |       |
| Právo hospodařit s majetkem státu                                      | Podíl |
| Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 |       |

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

|                               |
|-------------------------------|
| Typ                           |
| Věcné břemeno (podle listiny) |

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


📍 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.11.2022 14:00.

## Informace o pozemku

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Parcelní číslo:           | <a href="#">1779/1</a>                  |
| Obec:                     | <a href="#">Obrataň [548472]</a>        |
| Katastrální území:        | <a href="#">Obrataň [708712]</a>        |
| Číslo LV:                 | <a href="#">10001</a>                   |
| Výměra [m <sup>2</sup> ]: | 8612                                    |
| Typ parcely:              | Parcela katastru nemovitostí            |
| Mapový list:              | <a href="#">GUST2880.V.S.VIII-25-15</a> |
| Určení výměry:            | Graficky nebo v digitalizované mapě     |
| Způsob využití:           | silnice                                 |
| Druh pozemku:             | ostatní plocha                          |

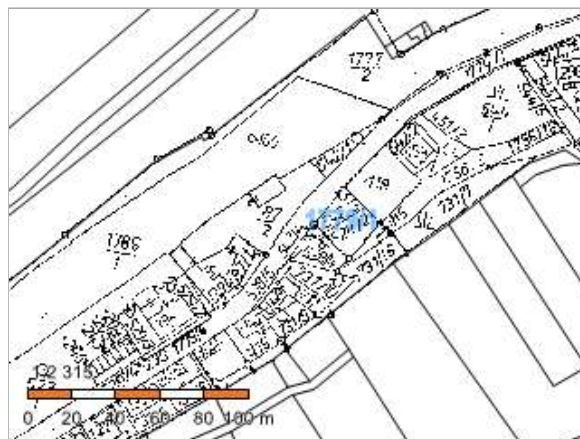

## Vlastníci, jiní oprávnění

### Vlastnické právo

Podíl

Obec Obrataň, č. p. 204, 39412 Obrataň

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

### Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📍 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Pelhřimov](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.11.2022 14:00.

PPD - Propočet projektové dokumentace  
Specifikace nákladů dle CTN

Ceník: x VP TEMO 2021 - STAND. x 2022.12  
Položková databáze: 2022.12

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Název stavby:</b> | <b>VPIC III_1292 PE Obrataň, ul. Nádražní</b> |
| Číslo SPP prvku:     |   |
| Zhotovitel PD:       | SP  |

Rekapitulace nákladů:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| PŘÍPRAVA                          | 22 087,31 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE                       | 29 412,51 Kč |
| MONTÁŽ                            | 62 097,34 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA         | 6 598,57 Kč  |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE        | 6 598,57 Kč  |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA            | 7 603,30 Kč  |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE           | 53 013,97 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | 24 156,25 Kč |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Celkové náklady:</b> | <b>211 567,82 Kč</b> |
|-------------------------|----------------------|

| Číslo SAP                  | Seznam položek<br>Název položky                 | Množství    | Celková cena |
|----------------------------|---|-------------|--------------|
| PŘÍPRAVA                   |   |             |              |
| 958210                     | Návrh cenový a technický bez projednání         | 1.00 ks     | 5 546,95 Kč  |
| 953634                     | Projekt tlkm liniové metalické sítě             | 16540.36 JV | 16 540,36 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE                |   |             |              |
| 954970                     | Pokládka PE nebo vrapované chráničky            | 13.00 m     | 301,73 Kč    |
| 954974                     | Povrchy nad rámeč zámková dlažba                | 2.00 m2     | 2 083,50 Kč  |
| 958554                     | Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti            | 1.00 ks     | 5 866,63 Kč  |
| 955551                     | Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm              | 20.00 m     | 1 365,20 Kč  |
| 954959                     | Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm        | 12.00 m     | 2 843,88 Kč  |
| 955577                     | Rýha v chodníku 35/50-70                        | 10.00 m     | 6 776,40 Kč  |
| 955578                     | Rýha v chodníku rozšíření o10cm                 | 12.00 m     | 2 325,48 Kč  |
| 952362                     | Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70         | 7.00 m      | 5 918,50 Kč  |
| 952345                     | Rýha v trávě 35/70-100                          | 3.00 m      | 1 303,44 Kč  |
| 955053                     | Vytyčení trasy v zastavěném terénu              | 45.00 m     | 627,75 Kč    |
| MONTÁŽ                     |   |             |              |
| 955030                     | Demontáž úložných kabelů do 50 XN               | 5.00 m      | 138,25 Kč    |
| 955029                     | Demontáž úložných kabelů do15 XN                | 5.00 m      | 114,80 Kč    |
| 955824                     | Instal.metal. kab. do stávajících trubek        | 26.00 m     | 1 476,28 Kč  |
| 952649                     | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka  | 3.00 ks     | 599,88 Kč    |
| 952650                     | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka | 32.00 ks    | 1 473,28 Kč  |
| 952644                     | Měření střídavé během stavby - další čtyřka     | 32.00 ks    | 983,68 Kč    |
| 952643                     | Měření střídavé během stavby - první čtyřka     | 3.00 ks     | 322,92 Kč    |
| 952647                     | Měření útlumu během stavby- první čtyřka        | 3.00 ks     | 599,88 Kč    |
| 955000                     | Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním        | 100.00 ks   | 3 839,00 Kč  |
| 954982                     | Montáž samonosných kabelů nad 5 XN              | 45.00 m     | 2 421,90 Kč  |
| 955281                     | Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek          | 6.00 ks     | 8 761,08 Kč  |
| 954990                     | Montáž úložných kabelů do 15 XN                 | 12.00 m     | 314,04 Kč    |
| 954991                     | Montáž úložných kabelů do 50 XN                 | 12.00 m     | 386,64 Kč    |
| 957753                     | Realizace tratě síťové dohodou                  | 19840.00 JV | 19 840,00 Kč |
| 958469                     | Uvedení stavby do provozu - kolaudace           | 5262.56 JV  | 5 262,56 Kč  |
| 954985                     | Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru          | 2.00 ks     | 6 018,46 Kč  |
| 958555                     | Zpracování dok. skut. provedení do 50 m         | 1.00 ks     | 1 303,43 Kč  |
| 955024                     | Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru          | 2.00 ks     | 4 013,96 Kč  |
| 955023                     | Zrušení samonosných kabelů nad 5 XN             | 45.00 m     | 1 622,25 Kč  |
| 955066                     | Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.          | 2.00 ks     | 2 029,20 Kč  |
| 955041                     | Zrušení úložných kabelů do 50 XN                | 15.00 m     | 322,20 Kč    |
| 955040                     | Zrušení úložných kabelů do15 XN                 | 15.00 m     | 253,65 Kč    |
| GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA  |   |             |              |
| 956278                     | Předměření trasy do 100 m                       | 1.00 ks     | 6 598,57 Kč  |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE |   |             |              |
| 956281                     | Doměření trasy do 100 m                         | 1.00 ks     | 6 598,57 Kč  |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA     |   |             |              |
| 955313                     | Uzavření sml. o SB o VBR                        | 2.00 ks     | 7 603,30 Kč  |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE    |   |             |              |

|        |   |             |              |
|--------|---|-------------|--------------|
| 958747 | Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)   | 1.00 ks     | 3 261,03 Kč  |
| 954830 | Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene<br>úhrada za VBŘ - uložení do mostní konstrukce<br>12m x 3000Kč + 8m x 200Kč | 37600.00 JV | 37 600,00 Kč |
| 955315 | Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ  | 2.00 ks     | 5 023,62 Kč  |
| 958085 | Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN   | 2.00 ks     | 7 129,32 Kč  |

| Číslo SAP                         | Limitka materiálu<br>Název položky       | Množství | Celková cena |
|-----------------------------------|--|----------|--------------|
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný |  |          |              |
| 303918                            | Deska krycí plast. 300x1000 mm           | 20.00 ks | 800,80 Kč    |
| 305789                            | Drát ocelový pozink. D 4,0 mm            | 0.60 kg  | 47,11 Kč     |
| 303813                            | Fólie výstražná 330mm PE oranžová        | 20.00 m  | 93,00 Kč     |
| 303777                            | Fólie výstražná 80mm PE červenobílá      | 50.00 m  | 110,00 Kč    |
| 300264                            | Kabel plastový TCEPKPFLE 35x4x0,4        | 25.00 m  | 2 348,75 Kč  |
| 300105                            | Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4         | 25.00 m  | 585,25 Kč    |
| 300170                            | Kabel samonosný TCEKFLES 10x4x0,4        | 45.00 m  | 3 146,40 Kč  |
| 302550                            | Mini Marker 1401 3M Ball                 | 4.00 ks  | 968,20 Kč    |
| 312425                            | Modul konektor. 9700-10P                 | 20.00 ks | 475,00 Kč    |
| 306745                            | Napínač šroubový oko-oko M 16            | 2.00 ks  | 274,76 Kč    |
| 307247                            | Objímka kotevní D 140 mm                 | 2.00 ks  | 235,52 Kč    |
| 309698                            | Očnice kovová FeZn pro lano 10mm         | 2.00 ks  | 130,84 Kč    |
| 305506                            | Patka stožárová EZP 16x20x290 cm         | 2.00 ks  | 5 285,78 Kč  |
| 301331                            | Sloup dřevěný 6,5m-impregnace Korasit CK | 2.00 ks  | 4 919,44 Kč  |
| 320312                            | Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15   | 2.00 ks  | 306,72 Kč    |
| 312845                            | Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE  | 2.00 ks  | 871,92 Kč    |
| 312881                            | Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE  | 4.00 ks  | 3 027,28 Kč  |
| 307033                            | Svorka lanová D 9-12 mm                  | 4.00 ks  | 62,56 Kč     |
| 306843                            | Svorník M 20x410x90x25                   | 4.00 ks  | 235,52 Kč    |
| 302343                            | Trubka vrapovaná 40/32 s lankem          | 13.00 m  | 231,40 Kč    |
